



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO




# INFORME DE OBRA.

SUPERVISIÓN DE OBRA: U. Q. ROO CANCÚN.  
Reporte de avance al **14** de **SEPTIEMBRE** del **2018**.



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
 Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
 Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

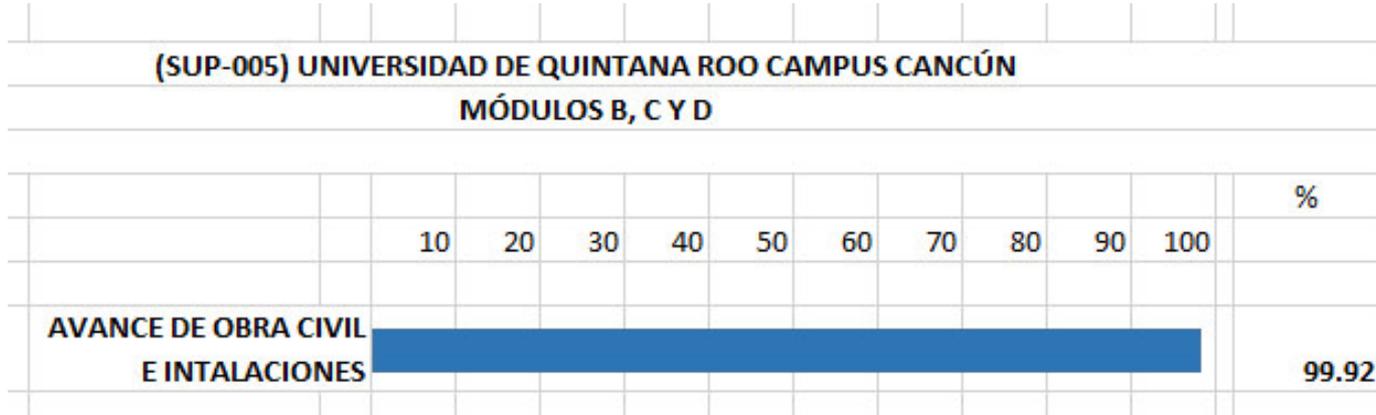

**AVANCE FINANCIERO**

MODULO	CONTRATO	ANTICIPO	ESTIMADO	PAGADO	% AV. FIN (INCLUYE ANTICIPO)
B	26,178,649.94	7,853,594.98	14,842,301.09	14,842,301.09	86.70%
C	18,631,238.00	5,589,371.40	10,902,350.62	10,902,350.62	88.52%
D	8,355,338.34	2,506,601.50	4,514,379.14	4,514,379.14	84.03%
INST_ELE _ A/C	19,254,553.82	5,776,366.15	11,669,821.56	10,595,657.74	85.03%
ESTACION AMIENTO	6,709,442.72	2,012,832.82	2,698,513.44	2,294,513.44	64.20%



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



# MODULO B



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**CONTRATISTA:** JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

**CONTRATO:** LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17

**MONTO DE CONTRATO:** \$ 26'178,649.94

**PERIODO DE CONTRATO:** 180 DIAS NATURALES

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 18 DE DICIEMBRE 2017 A 15 DE JUNIO DE 2018.

**PERIODO DE CONVENIO:** 16 DE JUNIO 2018 A 30 DE JUNIO DE 2018.

**COMPONENTES:** EDIFICIO DE 6 PLANTAS

- ✚ PLANTA BAJA: CAFETERIA, AREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL.
- ✚ 1ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 2DO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 3ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 4TO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 5TO NIVEL: 2 AULAS Y TERRAZA.

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 18 DE DICIEMBRE DE 2017



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Notas Relevantes

### SE REALIZAN TRABAJOS DE

- CONTINUAN CON DETALLADO EN PINTURA
- CONTINUAN CON LIMPIEZA
- CONTINUAN CON COLOCACION DE MANIJAS EN VENTANAS DE PROYECCION



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-B	
PERFIL	CANTIDAD
PASTERO	1
ALBAÑIL	1
AYUDANTE EN GENERAL	4
LIMPIEZA	2
SUPERINTENDENTE	1
<b>SUMA</b>	<b>9</b>

MAQUINARIA Y EQUIPO M-B	
PERFIL	CANTIDAD
GENERADOR DE CORRIENTE 8HF	1
GENERADOR MAXILIGHT	1
GENERADOR DE VOLTAJE 220	1
REHILETE ELECTRICO	1
SIERRA ELECTRICA	1
<b>SUMA</b>	<b>5</b>

**DISMINUYÓ SU FUERZA DE TRABAJO A RAZÓN DE 3 PERSONAS, CON DISMINUCIÓN DE UN EQUIPO EN MAQUINARIA DE OBRA CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE**




**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## GRAFICO DE AVANCES

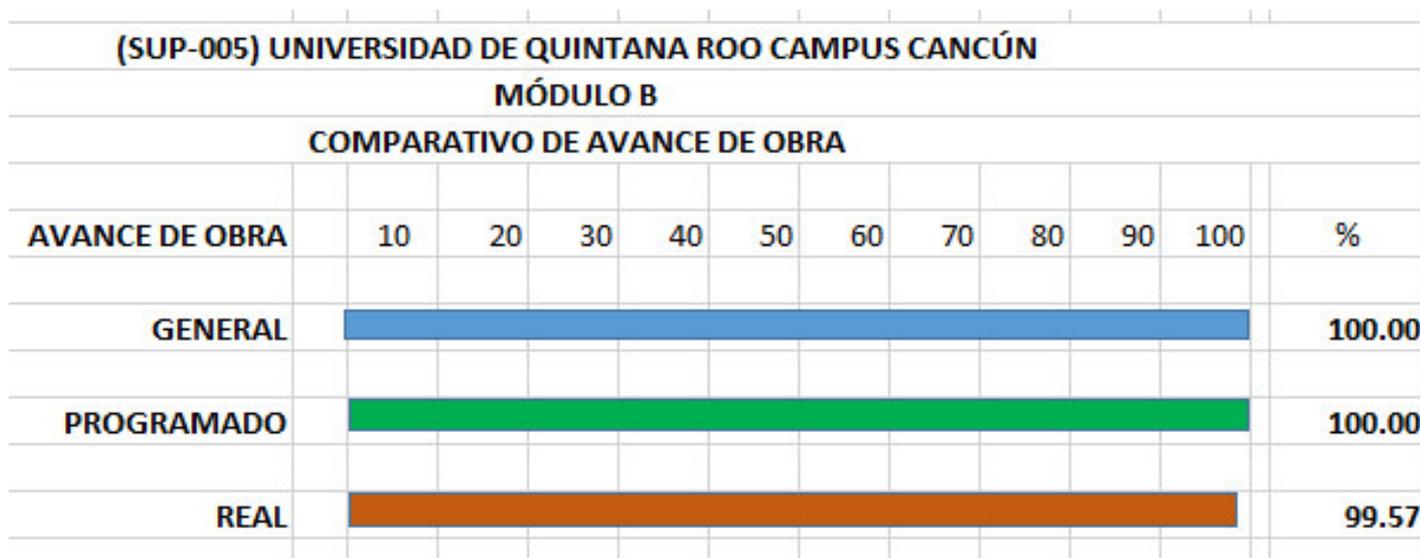

**NOTA: NO SE CONSIDERA AL 100 % DEBIDO A QUE DEBE SUSTITUIR CRISTALES EN ZONA DE CAFETERIA Y A LA COLOCACION DE VINILO EN FACHADA INTEGRAL.**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## TABLA DE ESTIMACIONES

### ESTIMACIONES MODULO B

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE
01	445,641.06
02	332,621.50
03	433,727.92
04	681,034.06
05	1,024,188.07
06	925,050.33
07	1,644,101.26
08	1,119,862.84
09	584,544.31
10	3,245,022.23
11	866,064.49
12	3,540,443.02

**SUMAS 14,842,301.09**

### JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
				445,641.06
				332,621.50
				433,727.92
				681,034.06
				1,024,188.07
				925,050.33
				1,644,101.26
				1,119,862.84
				584,544.31
				3,245,022.23
				866,064.49
				3,540,443.02

-

-

-

**14,842,301.09**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún

Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



# MODULO C



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**CONTRATISTA:** JOELRO CONSTRUCCIONES SA DE CV

**CONTRATO:** LP-IFEQROO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17

**MONTO DE CONTRATO:** \$ 18'631,238.43

**PERIODO DE CONTRATO:** 150 DIAS NATURALES

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 18 DE DICIEMBRE 2017 A 06 DE JUNIO DE 2018.

**COMPONENTES:** EDIFICIO DE 4 PLANTAS

- ✚ PLANTA BAJA: AREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL, GIMNASIO Y NUCLEO SANITARIOS.
- ✚ 1ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 2DO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 3ER NIVEL: 2 AULAS Y TERRAZA

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 18 DE DICIEMBRE DE 2017



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Notas Relevantes

### SE REALIZAN TRABAJOS DE

- DETALLADO EN PINTURA
- REPARACION DE FISURA EN JUNTA CONSTRUCTIVA CON MOD B



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-C	
PERFIL	CANTIDAD
Residente de obra	1
Alumineros	1
Plomero	1
Ayudantes	1
Limpieza	1
Chofer	1
<b>SUMA</b>	<b>6</b>

**DISMINUYÓ SU MANO DE OBRA A RAZÓN DE 2 PERSONAS 2, CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE.**




**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## GRAFICO DE AVANCES

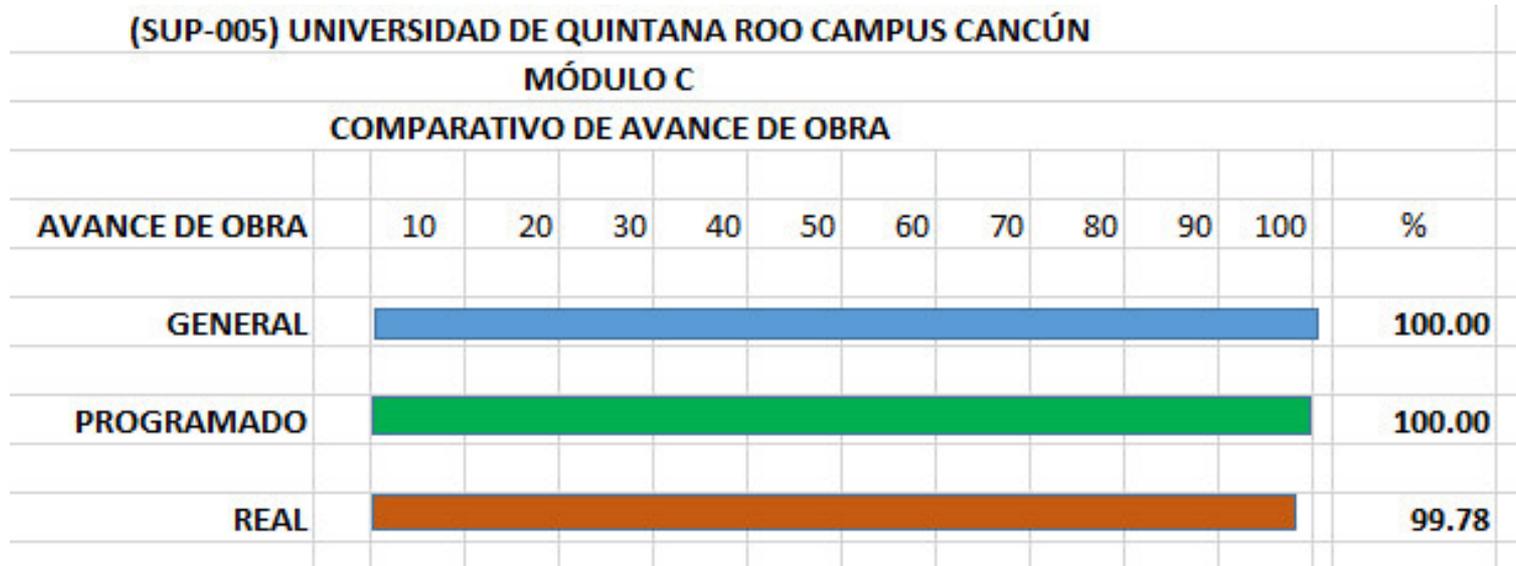

**NOTA: NO SE CONSIDERA AL 100 % DEBIDO A QUE DEBE SUSTITUIR CRISTALES EN ZONA DE GIMNASIO.**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**TABLA DE ESTIMACIONES**

**ESTIMACIONES MODULO C**

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO
01	1,162,101.26
02	1,003,525.35
03	1,005,166.32
04	1,919,936.16
05	1,231,943.48
06	1,479,959.49
07	1,298,755.13
08	1,800,963.43
<b>SUMAS</b>	<b>10,902,350.62</b>

**JOELRO CONSTRUCCIONES SA DE CV**

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
-				1,162,101.26
-				1,003,525.35
				1,005,166.32
				1,919,936.16
-				1,231,943.48
				1,479,959.49
				1,298,755.13
				1,800,963.43
-	-	-		<b>10,902,350.62</b>



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



# MODULO D



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**CONTRATISTA:** JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

**CONTRATO:** LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17

**MONTO DE CONTRATO:** \$ 8'355,338.34

**PERIODO DE CONTRATO:** 120 DIAS NATURALES

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 18 DE DICIEMBRE 2017 A 15 DE MAYO DE 2018

**PERIODO DE CONVENIO:** 15 DE MAYO 2018 A 15 DE JUNIO DE 2018.

**COMPONENTES:** EDIFICIO DE 2 NIVELES

- ✚ PLANTA BAJA: AUDITORIO/USOS MULTIPLES 207 PERSONAS.
- ✚ 1ER NIVEL: 2 AULAS

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 18 DE DICIEMBRE DE 2017



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Notas Relevantes

### **SE REALIZAN TRABAJOS DE**

- REPARACION DE LOSETA EN TERRAZA
- DETALLADO EN PINTURA



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Recursos disponibles

MAQUINARIA Y EQUIPO M-D	
PERFIL	CANTIDAD
MAXILIGHT	1
CORTADORAS DE DISCO	2
GENERADORES	1
SUMA	4

MANO DE OBRA M-D	
PERFIL	CANTIDAD
CABO	1
COLOCADOR	1
AYUDANTE EN GENERAL	2
SUMA	4

**SIN CAMBIOS EN SU FUERZA DE TRABAJO Y EQUIPO CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## TABLA ESTIMACIONES

### ESTIMACIONES MODULO D

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO
01	260,022.46
02	79,617.01
03	442,750.26
04	604,681.29
05	610,298.20
06	368,806.91
07	245,181.52
08	224,053.58
09	468,172.03
10	557,847.98
11	147,074.87
12	505,873.03

**4,514,379.14**

### JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
-				260,022.46
-				79,617.01
-				442,750.26
				604,681.29
				610,298.20
				368,806.91
				245,181.52
				224,053.58
			-	468,172.03
			-	557,847.98
				147,074.87
				505,873.03

**4,514,379.14**




**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## GRAFICO DE AVANCES

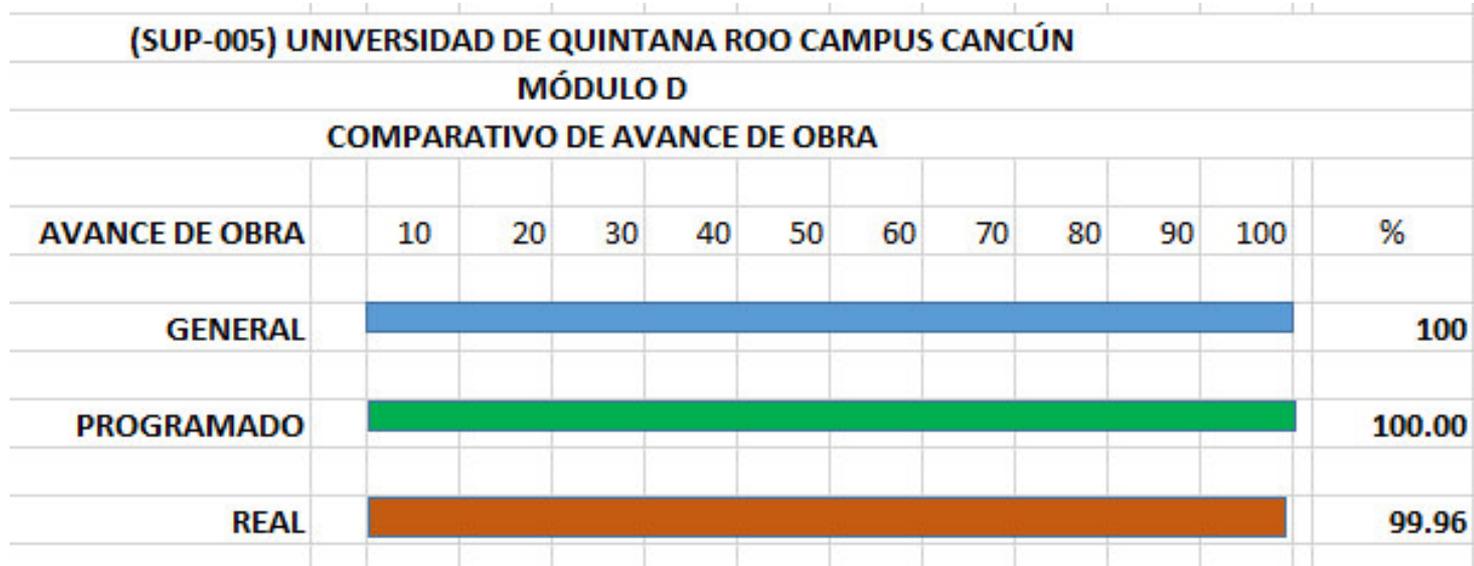

**NOTA: NO SE CONSIDERA AL 100 % DEBIDO A QUE DEBE CORREGIR DETALLES Y A LA COLOCACION DE VINILO EN FACHADA INTEGRAL.**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



# INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**CONTRATISTA: MARIO RIVERO**

**CONTRATO: LP-IFEQROO-RIVEROLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17**

**MONTO DE CONTRATO: \$ 19'254,553.82**

**PERIODO DE CONTRATO: 120 DIAS NATURALES**

**PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE ABRIL 2017 A 21 DE AGOSTO DE 2017**

**PERIODO DE CONVENIO: 05 DE MZO 2018 A 02 DE JULIO DE 2018**


**COMPONENTES: INSTALACION ELECTRICA EN LOS MODULOS B, C Y D**

**INICIO DE LOS TRABAJOS: 22 DE ENERO DE 2018**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

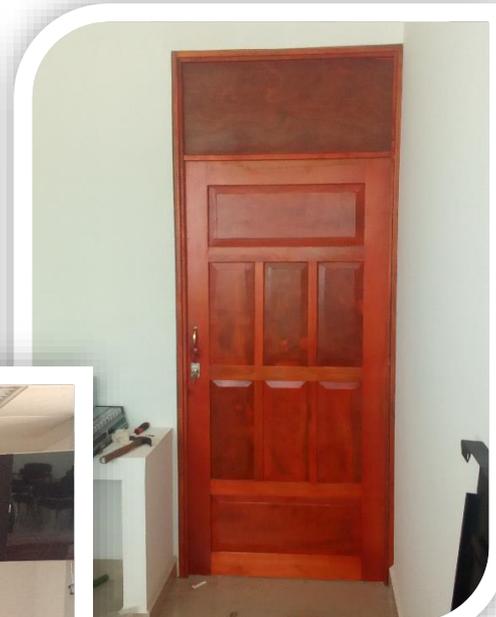



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Recursos disponibles

MANO DE OBRA INSTALACIONES ELEC Y AC		
PERFIL	CANTIDAD	
CABO	1	
OFICIAL ELECTRICO	1	
AYUDANTE EN GENERAL	1	
SUPERINTENDENTE	1	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	
	SUMA	5

**SIN CAMBIOS EN SU FUERZA DE TRABAJO CON RESPECTO A LA SEMANA  
DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## TABLA ESTIMACIONES

### ESTIMACIONES

### MARIO FÉLIX RIVERO LEAL

	PRESENTADAS	EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO					
01	577,875.93					577,875.93
02	1,246,943.92		\$ -			1,246,943.92
03	628,835.02	-	\$ -			628,835.02
04	365,298.71					365,298.71
05	3,398,004.19		\$ -			3,398,004.19
06	4,378,699.97					4,378,699.97
07	1,074,163.82		\$ -		1,074,163.82	
	<b>11,669,821.56</b>	-	-		<b>1,074,163.82</b>	<b>10,595,657.74</b>




**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**GRAFICO DE AVANCES**

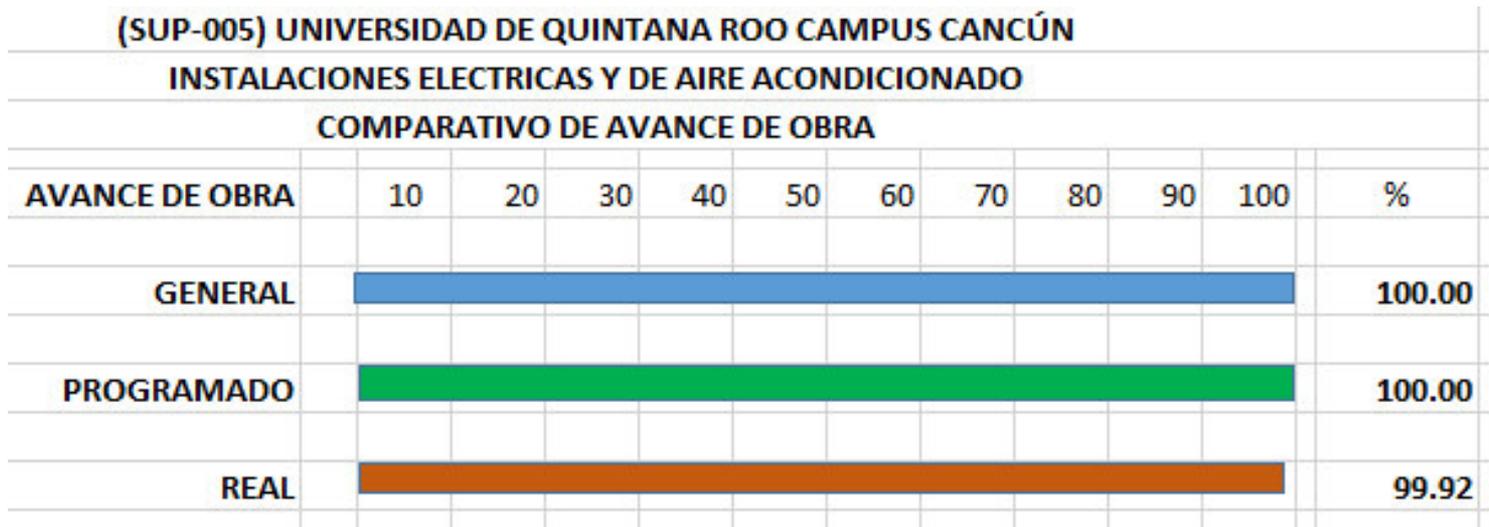

**NOTA: NO SE CONSIDERA AL 100 % DEBIDO A QUE SE ESTAN REALIZANDO PRUEBAS AL EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN GENERAL.**



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



# JUICIOS ORALES Y ESTACIONAMIENTO



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**CONTRATISTA:** FORZA DRILL, S.A. DE C.V.

**CONTRATO:** LP-IFEQROO-FORZA-FAMSUPCIEN-OB-098/18

**MONTO DE CONTRATO:** \$ 7'782,953.56

**PERIODO DE CONTRATO:** 26 DIAS NATURALES

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 20 DE JUNIO 2018 A 15 DE JULIO DE 2018.

**PERIODO DE CONVENIO:** .

**COMPONENTES:** ESTACIONAMIENTO Y JUICIOS ORALES

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** 20 DE JUNIO DE 2018



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Recursos disponibles

MANO DE OBRA ESTACIONAMIENTO y	
PERFIL	CANTIDAD
Residente de obra	1
Topografo	1
ayte topografo	1
Carpinteros	1
voz y datos	2
Operador	1
checador	1
SUMA	8

MAQUINARIA Y EQUIPO estacionamiento	
PERFIL	CANTIDAD
VIBROCOMPACTADOR TERRACEF	1
MOTOCONFORMADORA	1
RETROEXCAVADORA CAT 320D	1
SUMA	3

### NOTAS:

- 1.-SIN CAMBIOS EN SU FUERZA DE TRABAJO
- 2.-SIN CAMBIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ELLO CON REFERENCIA AL PERIODO DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Notas Relevantes

### REINICIA ACTIVIDADES CON:

- COLOCACION DE PUERTAS DE MADERA EN SALON DE JUICIOS ORALES



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## TABLA ESTIMACIONES

ESTIMACIONES		FORZA DRILL SA DE CV				
	PRESENTADAS	EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO					
01	2,294,513.44					2,294,513.44
02	470,851.17		\$ -			470,851.17
03	-	-	\$ -			-
04	-		\$ -			
	2,765,364.61	-	-			2,765,364.61



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.




## GRAFICO DE AVANCES

(SUP-005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN

ESTACIONAMIENTO Y JUICIOS ORALES

COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA

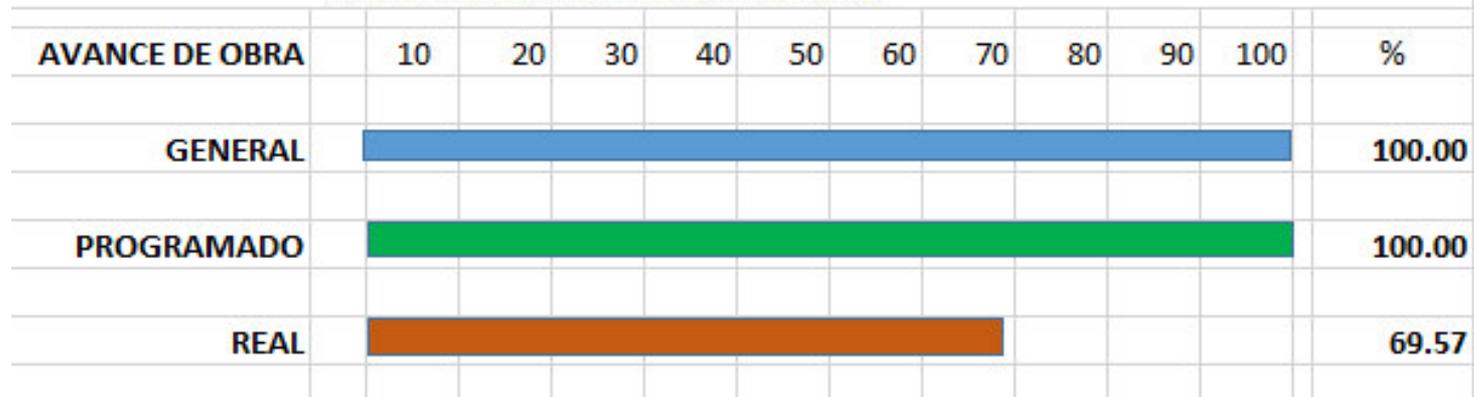

EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN DE AVANCES....



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



# UQROO-PLAYA DEL CARMEN



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



**CONTRATISTA:** GRUPO RICAMAR ARQUITECTURA Y CONSULTORIA SA DE CV

**CONTRATO:** POR DEFINIR (PROCESO DE FIRMA)

**MONTO DE CONTRATO:** \$ 7'519,707.99

**PERIODO DE CONTRATO:** 900 DIAS NATURALES

**PERIODO DE EJECUCIÓN:** 13 DE AGOSTO 2018 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.

**PERIODO DE CONVENIO:** NO SE HA DADO TRAMITE HASTA RECIBIR ANTICIPO.

**COMPONENTES:**

- ✚ ACABADOS EN PLAFON, PISOS Y PINTURAS.
- ✚ CANCELERIA EN FACHADAS
- ✚ RED CONTRA INCENDIOS

**INICIO DE LOS TRABAJOS:** POR INICIAR



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Notas Relevantes

### SE REALIZAN TRABAJOS DE

- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS PARA SALIDAS ELECTRICAS EN PLAFON
- SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTOS ELECTRICOS Y DE AIRE ACONDICIONADO
- INSTALACION DE RED CONTRA INCENDIO EN PLAFON



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



# CBTA DZIUCHÉ



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún  
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



## Notas Relevantes

### SE REALIZAN TRABAJOS DE

SE REALIZA

- CIMBRA EN LOSA,
- COLOCACION DE VIGUETAS Y BOBEDILLAS,
- MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010,
- INSTALACIONES ELECTRICAS
- APLANADO FINO EN MUROS Y PLAFONES,
- ASÍ COMO INSTALACION HIDRO SANITARIA EN BAÑOS

EL AVANCE REGISTRADO ES DEL 65 % FÍSICO

FECHA ESTIMADA DE TÉRMINO 21 DE OCTUBRE DE 2018
