



ING. ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA  
DIRECTOR GENERAL



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo III  
Oficio No.: IFEQROO.DG.DCySO.205.18

### INFORME DE LA COMISIÓN

**UNIDAD RESPONSABLE**

DIRECCION GENERAL

**FECHA DE ELABORACIÓN**

30 DE SEPTIEMBRE 2018

**DATOS GENERALES**

NOMBRE DEL COMISIONADO	<u>HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ</u>
CARGO DEL COMISIONADO	<u>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS</u>
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	<u>DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA</u>
PERIODO DE LA COMISIÓN	<u>DEL 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018</u>
LUGAR DE LA COMISIÓN	<u>UQROO-CANCÚN, UIMQROO JMM Q.ROO; UQROO-CHETUMAL OPB; UQROO-PLAYA: DIVERSAS ESCUELAS EN FCP</u>
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	<u>\$ 3,820.00</u>

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CIEN DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN" EN SUS MODULOS B, C Y D.

**CONTRATOS**

LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17  
LP-IFEQROO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17  
LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17  
LP-IFEQROO-RIVEROLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17

ASÍ COMO A LOS TRABAJOS QUE SE DESARROLLAN EN LA UQROO-CHETUMAL CAMPUS CENTRAL Y DIVISION DE CIENCIAS DE LA SALUD, ADEMÁS DE SUPERVISAR LOS TRABAJOS EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DEL MUNICIPIO DE JOSÉ MARIA MORELOS

SE ADJUNTA INFORME PORMENORIZADO

**FIRMA DEL COMISIONADO**


ARQ. HUGO HERIBERTO  
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALIS EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

**UQROO-PISTA**



**UQROO-DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD**

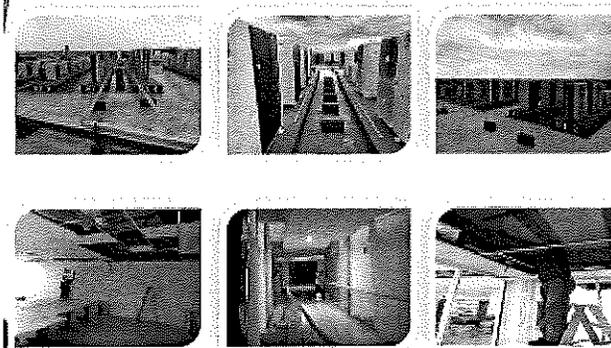

19 DE SEPTIEMBRE 2018

SE REALIZÓ RECORRIDO A LAS ESCUELAS:

JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO; JARDIN DE NIÑOS KI'MAC OCAL; JARDIN DE NIÑOS ZACIL KA'ANSAJ; CAM TUUMBEN KUXTAL DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO; ASÍ COMO LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE EROZA PENICHE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y ESCUELA PRIMARIA "FEDERICO DIAZ" EN LA LOCALIDAD DE KOP'CHEN, EN DONDE SE DEFINIERON ALCANCES Y ACCIONES A EJECUTAR EN LOS DIVERSOS PLANTELES REFERIDOS Y SE CONSTATÓ AQUELLOS DONDE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO REFLEJAN AVANCES DE OBRA Y SE TOMÓ ACCIÓN CORRECTIVA AL RESPECTO, EMITIENDO OFICIO DE AVISO DE APLICACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO.

FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERIBERTO  
GÓMEZ MARTÍNEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

20 DE SEPTIEMBRE 2018

SE REALIZÓ RECORRIDO A LAS ESCUELAS:

JARDIN DE NIÑOS "CHACTEMAL" Y JARDIN DE NIÑOS "KONEX Kanic" EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN; , EN DONDE SE DEFINIERON ALCANCES Y ACCIONES A EJECUTAR EN LOS DIVERSOS PLANTELES REFERIDOS Y SE CONSTATÓ QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO REFLEJAN AVANCES DE OBRA Y SE TOMÓ ACCIÓN CORRECTIVA AL RESPECTO, EMITIENDO OFICIO DE AVISO DE APLICACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO.

21 DE SEPTIEMBRE 2018

SE REALIZÓ RECORRIDO A LAS ESCUELAS:

SIETE DE NOVIEMBRE Y TELESECUNDARIA "ANSELMO TAMAY" EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL; ESCUELA PRIMARIA EN GAVILANES; UIMQROO EN JOSE MARIA MORELOS Y CBTA-DZIUCHE EN DONDE SE DEFINIERON ALCANCES Y ACCIONES A EJECUTAR EN LOS DIVERSOS PLANTELES REFERIDOS Y SE CONSTATÓ AQUELLOS DONDE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO REFLEJAN AVANCES DE OBRA Y SE TOMÓ ACCIÓN CORRECTIVA AL RESPECTO, EMITIENDO OFICIO DE AVISO DE APLICACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO.

FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERIBERTO  
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



# INFORME DE OBRA.

SUPERVISIÓN DE OBRA:

U. O. ROO CHETUMAL-BAHÍA


U. O. ROO-CHETUMAL-DCS

Reporte de avance al **21 de SEPTIEMBRE del 2018.**




**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de Pista y cancha en UQROO Chetumal  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



QUINTANA ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
2016 - 2022

# UQROO CHETUMAL- PISTA Y CANCHA

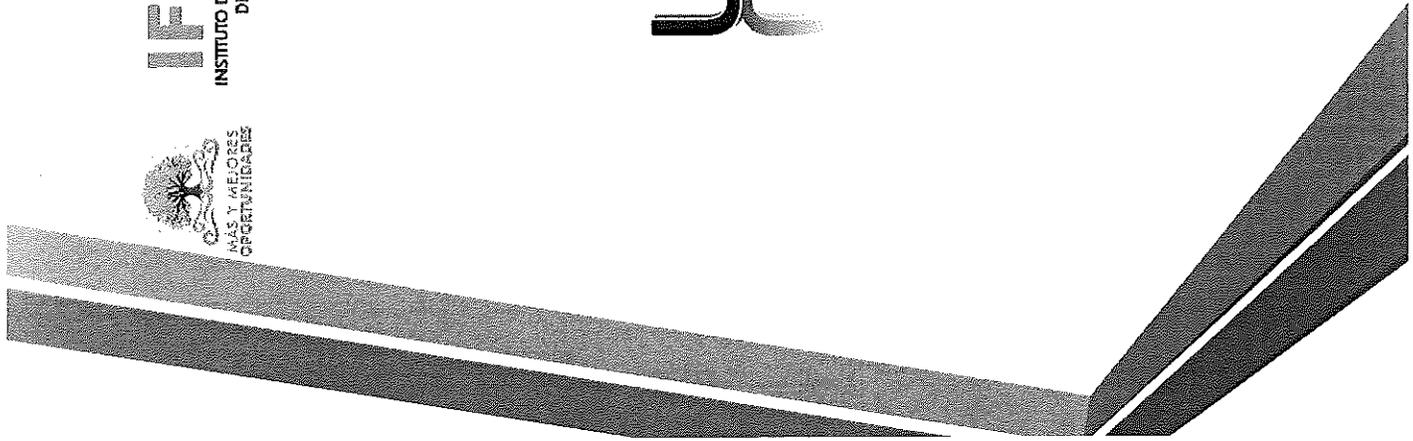



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de Pista y cancha en UQROO Chetumal  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



QUINTANA ROO  
ESTADO DE QUINTANA ROO  
2016-2022

**CONTRATISTA: CONSTRUCTORA AGSA SA DE CV**

**CONTRATO: LP-IFEQROO-AGSA-FAMSUP-OB-148/18**

**MONTO DE CONTRATO: \$ 10'199,312.98**

**PERIODO DE CONTRATO: 90 DIAS NATURALES**

**PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE AGOSTO 2018 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018.**

**COMPONENTES:**

- \*REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL.
- \*REPARACION DE PISTA DE ATLETISMO Y
- \*COLOCACION DE PISTA DE TARTAN
- \*RED DE DRENAJE PLUVIAL PERIMETRAL

**INICIO DE LOS TRABAJOS: 17 DE AGOSTO DE 2018**







**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Construcción de Pista y cancha en UQROO Chetumal  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



QUINTANA ROO  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
2016-2022

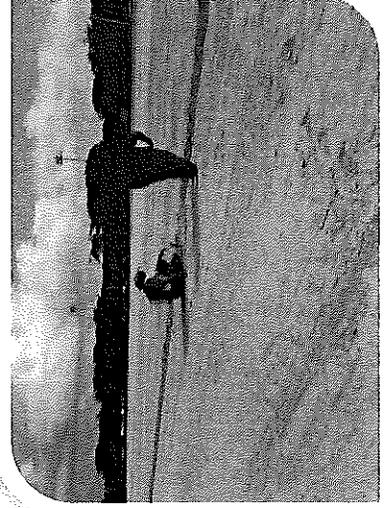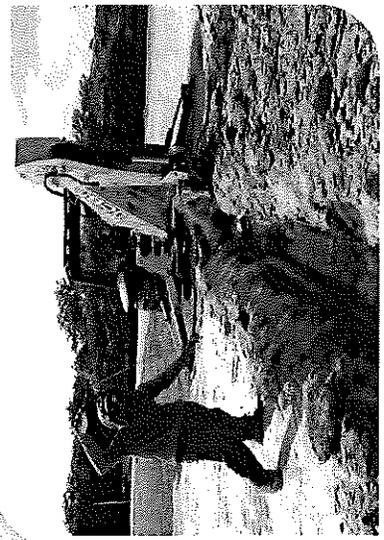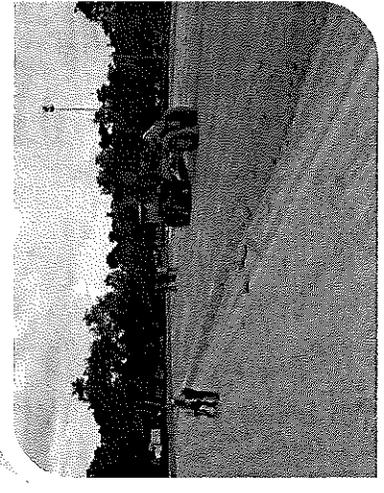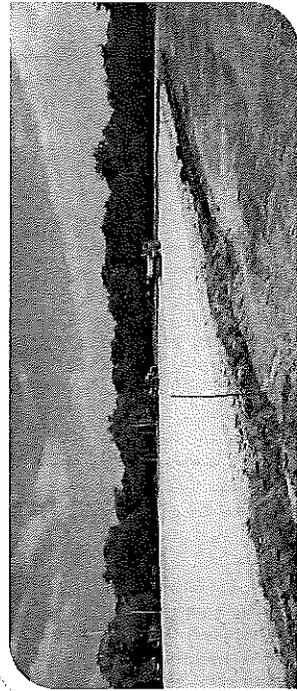




**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de Pista y cancha en UQROO Chetumal  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



QUINTANA ROO  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2016-2022

## Notas Relevantes

### SE REALIZAN TRABAJOS DE

- Se concluyo con la perforación de pozos de absorción a 20 m de profundidad.
- Se continuo la excavación para dren.
- Se continuo con la colocación de plantilla para granzón
- Se continuo con la colocación de tubería.
- Tendido y compactación en cancha para afine de plataforma
- Se relleno con grava en drenaje pluvial



**Recursos disponibles**

MAQUINARIA Y EQUIPO PISTA		MANO DE OBRA PISTA	
PERFIL	CANTIDAD	PERFIL	CANTIDAD
MOTOCOMPACTADORA	1	Residente de obra	1
VIBROCOMPACTADOR	1	Mtro. de obra	1
RETROEXCAVADORA	1	Perforacion	2
PERFORADOR PARA POZOS	2	cuadrilla topografica (3)	1
		ayudantes generales	2
		operador motoconformadora	1
		operador vibro	1
		operador retroexcavadora	1
<b>SUMIA</b>	<b>5</b>	<b>SUMIA</b>	<b>10</b>

Sin cambios en su fuerza de trabajo






**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


Supervisión de obra.

Rehabilitación en Dirección de Ciencias de la Salud  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



QUINTANA ROO  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
2016-2022

# UQROO-CHETUMAL DIRECCION DE CIENCIAS DE LA SALUD

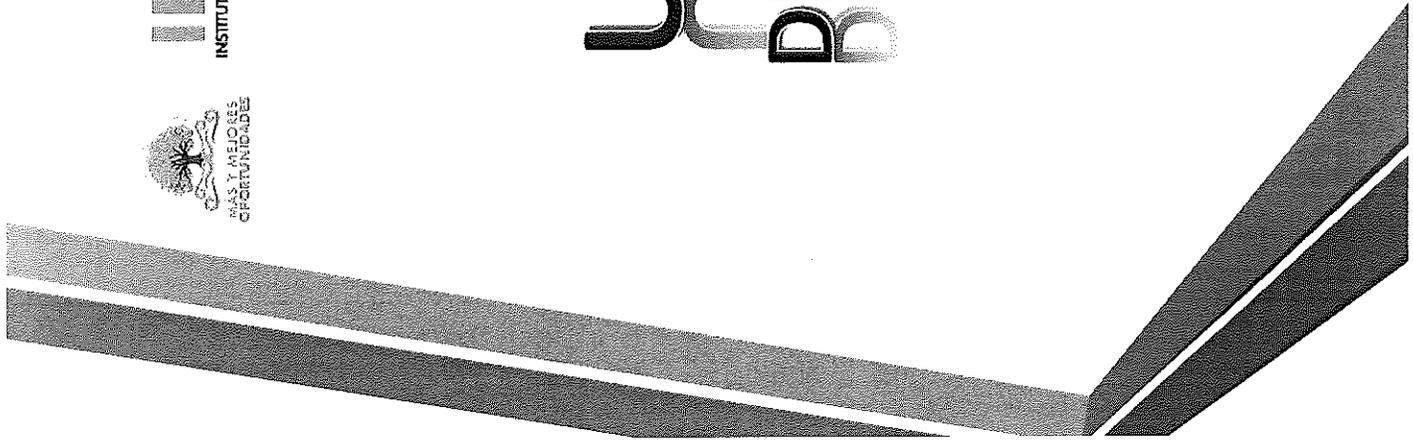



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Rehabilitación en Dirección de Ciencias de la Salud  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



**CONTRATISTA: REYNA BEATRIZ NAH CARAVEO**

**CONTRATO: LP-IFEQROO-RBNC-FAMSUP-OB-149/18**

**MONTO DE CONTRATO: \$ 3'504,607.65**

**PERIODO DE CONTRATO: 90 DIAS NATURALES**

**PERIODO DE EJECUCIÓN: 13 DE AGOSTO 2018 A 10 DE NOVIEMBRE DE 2018**

**PERIODO DE CONVENIO: SIN CONVENIO.**

**COMPONENTES:**

- \* REHABILITACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PLANTA BAJA, PRIMER Y SEGUNDO NIVEL.
- \* TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PLAFON, CORTINAS, PINTURA Y CANCELERIA

**INICIO DE LOS TRABAJOS: 13 DE AGOSTO DE 2018**








**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Rehabilitación en Dirección de Ciencias de la Salud  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.




QUINTANA ROO  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
2016-2022

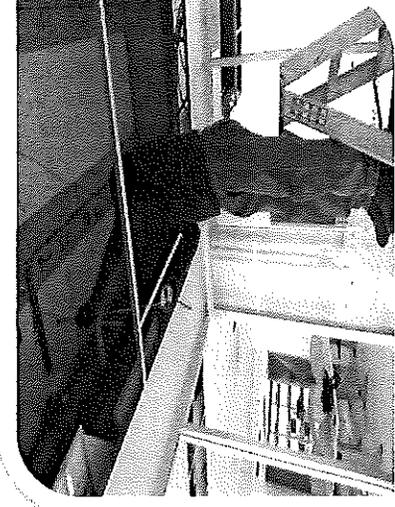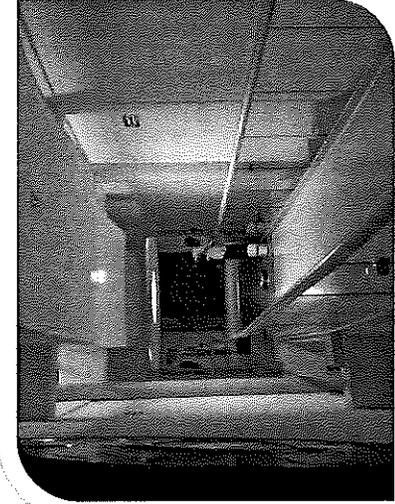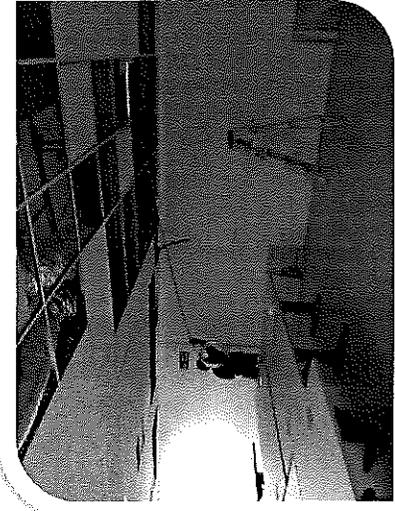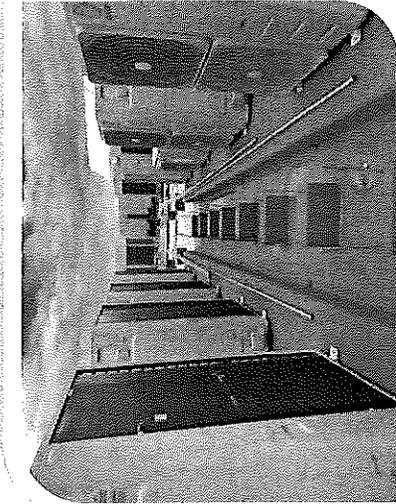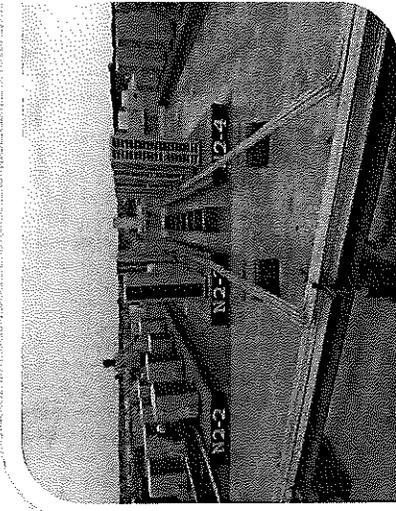



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Rehabilitación en Dirección de Ciencias de la Salud  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



QUINTANA ROO  
ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
2016-2022

## Notas Relevantes

### SE REALIZAN TRABAJOS DE:

#### Nivel uno

- Colocación de soportería.
- Forrado de tubería de cobre.
- Tendido de tubería de cobre diferentes diámetros.
- Tendido de cable de señal.
- Instalación de tablero de distribución.
- Tendido de tubería conduit galvanizada y accesorios.
- Tendido de cable diferente calibres.

#### Nivel dos

- Colocación de soportería.
- Forrado de tubería de cobre.
- Tendido de tubería de cobre diferentes diámetros.
- Tendido de cable de señal.
- Instalación de tablero de distribución.
- Tendido de tubería conduit galvanizada y accesorios.
- Tendido de cable diferente calibres.

#### Complementarios

- Aplicación de pintura en interior niveles 3 y 2 edificio 1.



**IFEQROO**  
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.  
Rehabilitación en Dirección de Ciencias de la Salud  
Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



**Recursos disponibles**


MANO DE OBRA, INSTALACIONES ELEC Y AC		MAQUINARIA Y EQUIPO DCS	
PERFIL	CANTIDAD	PERFIL	CANTIDAD
Técnicos aire acondicionado	2	POLIPASTO ELECTRICO	1
Supervisor eléctrico	1	TANQUE GAS BUTANO	1
Pintores	3	TANQUE NITROGENO	1
Superintendente	1	EQUIPO DE SOLDADURA	1
Auxiliar de Superintendente	1	ANDAMIOS TIPO VANQUETERO	4
Supervisor aire acondicionado	1	TANQUES DE OXIGENO	2
Ayudantes generales	2	<b>SUMA</b>	<b>10</b>
Ayudantes aire acondicionado	3		
Oficial electricista	1		
<b>SUMA</b>	<b>15</b>		



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Rehabilitación en Dirección de Ciencias de la Salud  
 Municipio Othón P. Blanco, Chetumal, Quintana Roo.



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO  
 2016-2022

**GRAFICO DE AVANCES**

(SUP-005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CHETUMAL										
DIRECCION DE CIENCIAS DE LA SALUD										
COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA										
	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
AVANCE DE OBRA										%
<b>GENERAL</b>										
<b>PROGRAMADO</b>										
<b>REAL</b>										



QROO.gob.mx

# COMISION DE TRABAJO No. IFEQROO.DG.DCYSO.205.18

## Datos Generales

### Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

### Tipo de servidor publico

No titular

### Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

### Ejercicio

2018

### Periodo que se reporta

septiembre

### Tipo de viaje

Nacional

### Número de personas acompañantes

0

### Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

## Datos de la comisión

### País de origen

México

### Estado de origen

Quintana Roo

### Ciudad de origen

Chetumal

### Municipio de origen

Othón P. Blanco

### País de destino

México

### Estado de destino

Quintana Roo

**Ciudad de destino**

CANCÚN, JOSE MARIA MORELOS, PLAYA DEL CARMEN

**Motivo del encargo o comisión**

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

**Fecha de salida**

2018-09-19

**Fecha de regreso**

2018-09-21

**Datos de la partida****Viáticos comprobados**

2175.00

**Viáticos sin comprobar**

0.00

**Importe ejercido por partida**

3820.00

**Partidas Adicionales****Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

**Importe ejercido por partida**

1645.00

**Recurso económico**

Estatal

**Importe total erogado con motivo del encargo o comisión**

3820.00

**Importe total no erogado**

55.00

**Fecha de entrega del informe**

2018-09-30

**Reportes****Actividades realizadas**

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CIENTEN DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN" EN SUS MODULOS B, C Y D, UQROO UNIDAD PLAYA DEL CARMEN, UQROO UNIDAD CHETUMAL Y DIVISION CIENCIAS DE LA SALUD, UIMQROO EN JOSE MARIA MORELOS Y CBTA EN DZIUCHE JMM

19 DE SEPTIEMBRE 2018

SE REALIZÓ RECORRIDO A LAS ESCUELAS:

JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO; JARDIN DE NIÑOS KI'MAC OCAL; JARDIN DE NIÑOS ZACIL KA'ANSAJ; CAM TUUMBEN KUXTAL DE LA LOCALIDAD DE FELIPE CARRILLO PUERTO; ASÍ COMO LA ESCUELA PRIMARIA SILVESTRE EROZA PENICHE EN LA LOCALIDAD DE SAN ANDRES Y ESCUELA PRIMARIA "FEDERICO DIAZ" EN LA LOCALIDAD DE KOP'CHEN, EN DONDE SE DEFINIERON ALCANCES Y ACCIONES A EJECUTAR EN LOS DIVERSOS PLANTELES REFERIDOS Y SE CONSTATÓ AQUELLOS DONDE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO REFLEJAN AVANCES DE OBRA Y SE TOMÓ ACCIÓN CORRECTIVA AL RESPECTO, EMITIENDO OFICIO DE AVISO DE APLICACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO.

20 DE SEPTIEMBRE 2018

SE REALIZÓ RECORRIDO A LAS ESCUELAS:

JARDIN DE NIÑOS "CHACTEMAL" Y JARDIN DE NIÑOS "KONEX Kanic" EN LA LOCALIDAD DE CANCÚN; , EN DONDE SE DEFINIERON ALCANCES Y ACCIONES A EJECUTAR EN LOS DIVERSOS PLANTELES REFERIDOS Y SE CONSTATÓ QUE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO REFLEJAN AVANCES DE OBRA Y SE TOMÓ ACCIÓN CORRECTIVA AL RESPECTO, EMITIENDO OFICIO DE AVISO DE APLICACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO.

21 DE SEPTIEMBRE 2018

SE REALIZÓ RECORRIDO A LAS ESCUELAS:

SIETE DE NOVIEMBRE Y TELESECUNDARIA "ANSELMO TAMAY" EN LA LOCALIDAD DE X-YATIL; ESCUELA PRIMARIA EN GAVILANES; UIMQROO EN JOSE MARIA MORELOS Y CBTA-DZIUCHE EN DONDE SE DEFINIERON ALCANCES Y ACCIONES A EJECUTAR EN LOS DIVERSOS PLANTELES REFERIDOS Y SE CONSTATÓ AQUELLOS DONDE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS NO REFLEJAN AVANCES DE OBRA Y SE TOMÓ ACCIÓN CORRECTIVA AL RESPECTO, EMITIENDO OFICIO DE AVISO DE APLICACIÓN DE FIANZAS DE CUMPLIMIENTO Y ANTICIPO.

**Resultados obtenidos**

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

**Contribuciones**

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTA

**Conclusiones**

SE RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

**Datos de la información**

**Periodo de actualización**

julio - septiembre

**Fecha de actualización de la información**

2018-09-30

**Fecha de validación de la información**

2018-09-30

**Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información**

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

**Importe total de la comisión**

3875.00

**COMISIONADO**  
*(Nombre y firma)*



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
