

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE PLANEACION	25-JULIO-2018

DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. BRUNO SEGOVIA BRITO
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	19 AL 20 DE JULIO DEL 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	MPIO SOLIDARIDAD : PLAYA DEL CARMEN
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 3,440.00

Por este medio informo las actividades de mi Comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar el levantamiento y verificación de los trabajos ejecutados en la Obra (S047) Continuación de la Construcción de la Biblioteca (V Etapa) en la Universidad de Quintana Roo Unidad Académica Playa del Carmen.


Jueves 19 de Julio del 2018: Con esta fecha se inició el recorrido, desde la ciudad de Chetumal a la Localidad de Playa del Carmen, del Municipio de Solidaridad, en transporte terrestre, en vehículo particular y se retornó en el mismo.
Actividades realizadas

Al estar el lugar de los trabajos se observa que el edificio principal de la unidad académica playa del Carmen, de la Universidad de Quintana Roo, están realizando trabajos de aplicación de pintura.

Aún no están realizando trabajos en el edificio de la biblioteca por parte de la empresa, consorcio R&G, S.A. de C.V.


Por consiguiente, se indica al superintendente que obra realice a la brevedad la colocación de piso en primer nivel, suministro y colocación de plafón en primer nivel, suministro de colocación de cancelería en primer nivel y aplicación de recubrimiento de pintura exterior.

Además, que se observa que el personal que está pintando el edificio principal de la unidad académica, pernocta en las aulas de la biblioteca.

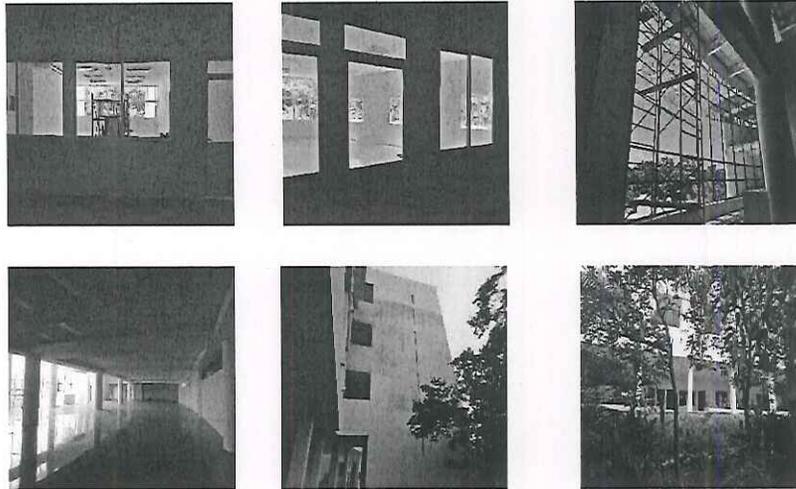

Viernes 20 de Julio del 2018: Con esta fecha se inició el recorrido, en la obra (S047) Continuación de la Construcción de la Biblioteca (V Etapa) en la Universidad de Quintana Roo Unidad Académica Playa del Carmen.

Aun no se presenta personal de trabajo, pero llama la atención que continúan pernoctando, el que está pintando el edificio principal de la Unidad Académica.

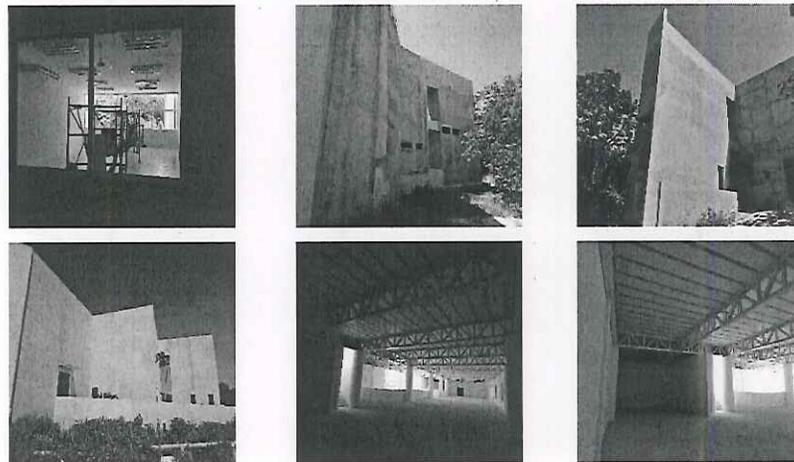

Sin más que informar por el momento, reciba usted un cordial saludo.

FIRMA DEL COMISIONADO
ING. BRUNO
SEGOVIA BRITO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
