

## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE PLANEACION


### FECHA DE ELABORACIÓN

12-OCTUBRE-2018

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. BRUNO SEGOVIA BRITO
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
PERIODO DE LA COMISIÓN	02 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	MPIO SOLIDARIDAD, PLAYA DEL CARMEN.
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 5,066.24


Por este medio informo las actividades de mi Comisión, el cual, tuvo como objetivo realizar el levantamiento y verificación de los trabajos ejecutados en la Unidad Académica Playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, en la localidad de Playa del Carmen del Municipio de Solidaridad.




### Martes 02 de octubre del 2018.

Con esta fecha se inició el recorrido, a la unidad académica de playa del Carmen de la Universidad de Quintana Roo, el Transporte en vehículo oficial con que cuenta con odómetro inicial de 5335 y final de 6035, con número de placas 724-E marca DODGE tipo ATTITUDE modelo 2018, en cual se retornó.


Al ingresar al edificio de la biblioteca se observa que el material de tabla roca se agotó como el de suspensión para la estructura del plafón, además que no hay personal de Empresa Consorcio R&G, S.A de C.V. para continuar con el plafón reticular y liso.



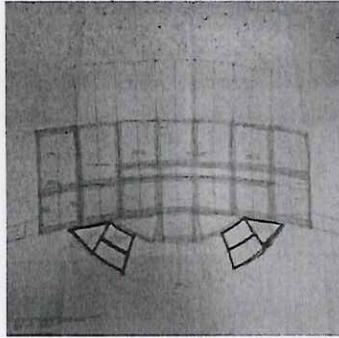

**Miércoles 03 de octubre del 2018.**

Otra empresa aun continua con los trabajos eléctricos en primer nivel como instalaciones de aires acondicionados, cabe señalar que es independiente a los trabajos que está ejecutando la empresa Consorcio R&G, S.A. de C.V.

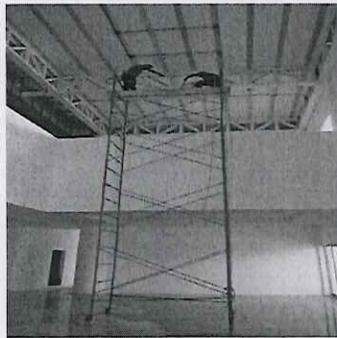


**Jueves 04 de octubre del 2018.**

Llega material de tabla roca y suspensión para la soporteria del plafón liso y reticular, solo dos trabajadores, llevan a cabo la continuación del proceso constructivo del plafón reticular y liso.




**Viernes 05 de octubre de 2018.**

El avance de obra es muy lento derivado a la fuerza de trabajo, dado que no se cuenta con el plafón power full terminado (plafón liso perimetral), no está terminada la portería reticular como colocar el plafón Armstrong, de igual forma existe área sin realizar ninguna soporteria.

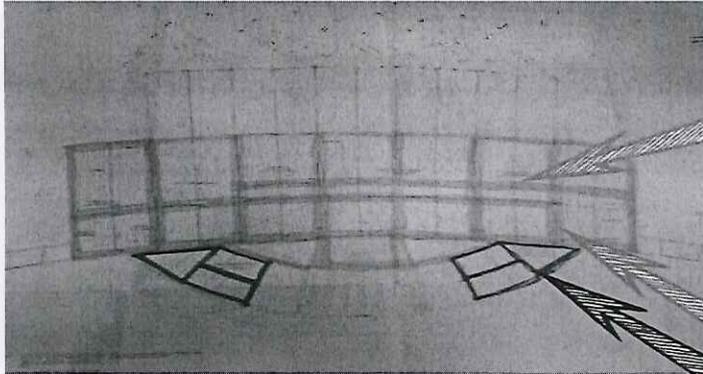

ÁREA QUE CUENTA CON SOPORTERIA EN PROCESO PARA PLAFÓN ARMTRONG Y POWER FULL.

ÁREA QUE NO CUENTA AUN CON SOPORTERIA PARA PLAFÓN ARMTRONG Y POWER FULL.

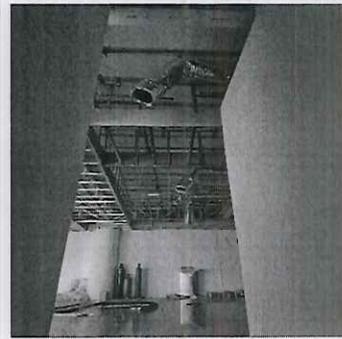

Sin más que informar por el momento, reciba usted un cordial saludo.

**FIRMA DEL COMISIONADO**  
ING. BRUNO  
SEGOVIA BRITO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
