



ING. ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo III
Oficio No.: IFEQROO.DG.DCySO.291.18

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION GENERAL

FECHA DE ELABORACION

07 DE DICIEMBRE 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ
CARGO DEL COMISIONADO	ENCARGADO DE LA DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION GENERAL
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 04 A 05 DE DICIEMBRE DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	BACALAR, TULUM Y BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,861.00

04 DE DICIEMBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN Y CON RECURSOS FAM EN LAS LOCALIDADES DE:

BACALAR:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PARA CONSTATAR LOS AVANCES REGISTRADOS POR LAS EMPRESAS QUE EJECUTAN TRABAJOS DE CANCELERIA, AIRES ACONDICIONADOS, PLAFONES, PISOS Y ELEVADOR...

SE PUDO APRECIAR, QUE SOLO EXISTÍA UNA CUADRILLA DE PERSONAL DE OBRA LABORANDO POR LO QUE SE INSTÓ A LAS EMPRESAS A INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO, TODA VEZ QUE LAS LABORES A REALIZAR SON MINIMAS PARA LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA DEL COMISIONADO


ARQ. HUGO HERIBERTO
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



FELIPE CARRILLO PUERTO:

SE VISITÓ LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO EN DONDE SE EJECUTAN DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE SON: CONSTRUCCIÓN DE UN PORTICO DE ACCESO CUYO AVANCE ES DEL 50% APROX Y LA CONSTRUCCIÓN DEL COMEDOR ESTUDIANTIL CON UN AVANCE DEL 30%, SE REALIZÓ RECORRIDO EN CONJUNTO CON AUTORIDADES ESCOLARES Y COMITÉ DE OBRA, ATENDIENDO LAS DUDAS DE LAS PARTES REFERENTE A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

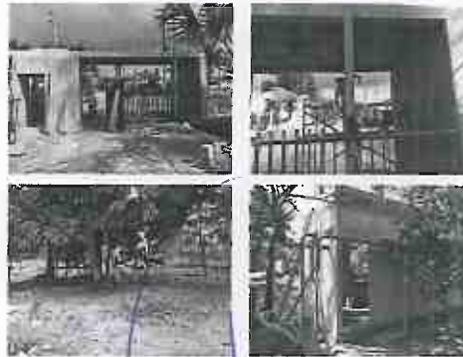

FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERIBERTO
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



ING. ABRAHAM RODRIGUEZ HERRERA
DIRECTOR GENERAL



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Anexo III
Oficio No.: IFEQROO.DG.DCySO.291.18

TRES REYES: SE VISITÓ LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIRES, BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE Y LA COLOCACION DE CELDAS SOLARES, SE COMENTÓ AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN COMENTO.



MUNICIPIO DE TULUM

LOCALIDAD CHEMUYIL,
SE VISITÓ EL JARDIN DE NIÑOS CHEMUYIL, EN DONDE SE PUDO CONSTATAR EL GRADO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION, CONSTRUCCION DE BAÑO DE DISCAPACITADOS Y TECHUMBRE DE ARCOTECHO, NO ASISTIÓ EL COMITÉ DE OBRA PESE A SER CONVOCADO.



FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERIBERTO
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

LOCALIDAD AKUMAL

SE VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN, INFORMANDO A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA E INQUIRIENDO SOBRE ANOMALIAS POSIBLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, A LO QUE RESPONDIERON QUE NO HABÍA HASTA EL MOMENTO INCONFORMIDAD ALGUNA CON LOS MISMOS.



05 DE DICIEMBRE DE 2018

BENITO JUAREZ

SE VISITÓ LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR PARA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA PLANCHA DE CONCRETO QUE SERVIRÁ PARA ALOJAR LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES DE LA ESCUELA EN COMENTO, VERIFICANDO QUE SE ENCUENTRA AL 100% DEL VOLUMEN CONTRATADO.




FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERIBERTO
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

JN ZOILA MARIA SABIDOS
POR REPORTE DE OBRA, SE DIO VISITA DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS BAJO EL ESQUEMA DE ESCUELAS AL 100, DETERMINANDO LA MALA CALIDAD DE LO HASTA AHORA REALIZADO EN PINTURA, TODA VEZ QUE NO REALIZARON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES AL CONCEPTO, POR LO QUE SE GIRARON LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A EFECTOS DE CORREGIR ESTA ANOMALIA.

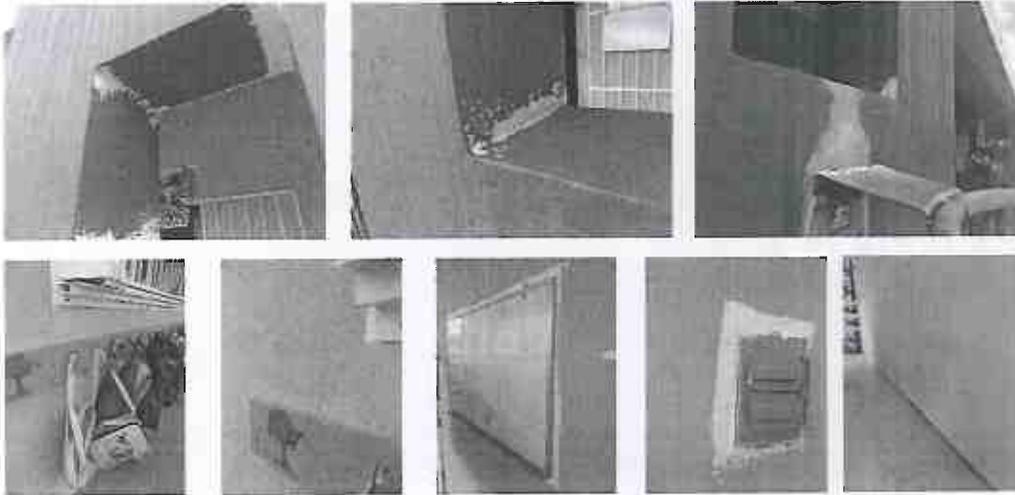

UQROO CANCUN
SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACION DE AVANCES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UQROO, DETERMINANDO LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA PARA EL MIERCOLES 12 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE A LAS 12 HRAS.

SE VISITÓ LA OBRA QUE SE EJECUTA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCANCUN, REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO, VERIFICANDO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA A NIVLE DE CARPETA ASFALTICA.

DE LA MISMA MANERA, SE VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL CAM LOUIS BRAILE DONDE SE CONSTATÓ QUE LOS DETALLES SEÑALADOS EN VISITAS PREVIAS, YA HABÍAN SIDO CORREGIDOS Y SOLVENTADOS.

FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERNANDEZ
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



QROO.gob.mx

COMISION DE TRABAJO No. IFEQROO.DG.DCYSO.291.18

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2018

Periodo que se reporta

diciembre

Tipo de viaje

Local

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

BACALAR, TULUM Y BENITO JUAREZ

Motivo del encargo o comisión

COORDINACIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y VIGILANCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

Fecha de salida

2018-12-04

Fecha de regreso

2018-12-05

Datos de la partida**Viáticos comprobados**

1461.00

Viáticos sin comprobar

39.00

Importe ejercido por partida

2861.00

Partidas Adicionales**Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes**

26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida

1400.00

Recurso económico

Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

2861.00

Importe total no erogado

139.00

Fecha de entrega del informe

2018-12-07

Reportes**Actividades realizadas**

04 DE DICIEMBRE 2018

SE VISITARON DIVERSAS ESCUELAS DONDE SE REALIZAN TRABAJOS BAJO EL PROGRAMA DE ESCUELAS AL CIEN Y CON RECURSOS FAM EN LAS LOCALIDADES DE:

BACALAR:

SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE OBRA PARA CONSTATAR LOS AVANCES REGISTRADOS POR LAS EMPRESAS QUE EJECUTAN TRABAJOS DE CANCELERIA, AIRES ACONDICIONADOS, PLAFONES, PISOS Y ELEVADOR...

SE PUDO APRECIAR, QUE SOLO EXISTÍA UNA CUADRILLA DE PERSONAL DE OBRA LABORANDO POR LO QUE SE INSTÓ A LAS EMPRESAS A INCREMENTAR SU FUERZA DE TRABAJO, TODA VEZ QUE LAS LABORES A REALIZAR SON MINIMAS PARA LA CULMINACIÓN DEL CONTRATO.

FELIPE CARRILLO PUERTO:

SE VISITÓ LA ESCUELA SECUNDARIA LEONA VICARIO EN DONDE SE EJECUTAN DOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA QUE SON: CONSTRUCCIÓN DE UN PORTICO DE ACCESO CUYO AVANCE ES DEL 50% APROX Y LA CONSTRUCCIÓN DEL

COMEDOR ESTUDIANTIL CON UN AVANCE DEL 30%, SE REALIZÓ RECORRIDO EN CONJUNTO CON AUTORIDADES ESCOLARES Y COMITÉ DE OBRA, ATENDIENDO LAS DUDAS DE LAS PARTES REFERENTE A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

TRES REYES: SE VISITÓ LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIRES, BENEFICIADA CON LA CONSTRUCCION DE UN POZO DE AGUA POTABLE Y LA COLOCACION DE CELDAS SOLARES, SE COMENTÓ AL C. DIRECTOR DE LA ESCUELA DEL INICIO DE LOS TRABAJOS EN COMENTO

MUNICIPIO DE TULUM

LOCALIDAD CHEMUYIL,

SE VISITÓ EL JARDIN DE NIÑOS CHEMUYIL, EN DONDE SE PUDO CONSTATAR EL GRADO DE AVANCE DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION, CONSTRUCCION DE BAÑO DE DISCAPACITADOS Y TECHUMBRE DE ARCOTECHO, NO ASISTIÓ EL COMITÉ DE OBRA PESE A SER CONVOCADO

LOCALIDAD AKUMAL

SE VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL JARDIN DE NIÑOS MALINTZIN, INFORMANDO A LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL EL AVANCE QUE SE LLEVA A LA FECHA E INQUIRIENDO SOBRE ANOMALIAS POSIBLES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, A LO QUE RESPONDIERON QUE NO HABÍA HASTA EL MOMENTO INCONFORMIDAD ALGUNA CON LOS MISMOS.

05 DE DICIEMBRE DE 2018

BENITO JUAREZ

SE VISITÓ LA ESCUELA PRIMARIA GUALBERTO SALAZAR PARA CONSTATAR LA TERMINACION DE LA PLANCHA DE CONCRETO QUE SERVIRÁ PARA ALOJAR LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA ESCUELA EN COMENTO, VERIFICANDO QUE SE ENCUENTRA AL 100% DEL VOLUMEN CONTRATADO.

JN ZOILA MARIA SABIDOS

POR REPORTE DE OBRA, SE DIO VISITA DE INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS BAJO EL ESQUEMA DE ESCUELAS AL 100, DETERMINANDO LA MALA CALIDAD DE LO HASTA AHORA REALIZADO EN PINTURA, TODA VEZ QUE NO REALIZARON LAS ACTIVIDADES PRELIMINARES AL CONCEPTO, POR LO QUE SE GIRARON LAS INSTRUCCIONES PERTINENTES A EFECTOS DE CORREGIR ESTA ANOMALIA.

UQROO CANCUN

SE REALIZÓ RECORRIDO DE VERIFICACION DE AVANCES EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA UQROO, DETERMINANDO LA FECHA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA PARA EL MIERCOLES 12 DE DISICEMBRE DEL PRESENTE A LAS 12 HRAS.

SE VISITÓ LA OBRA QUE SE EJECUTA EN LAS INSTALACIONES DEL ITCANCUN, REFERENTES A LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTACIONAMIENTO, VERIFICANDO QUE EL MISMO SE ENCUENTRA A NIVLE DE CARPETA ASFALTICA.

DE LA MISMA MANERA, SE VISITÓ LAS INSTALACIONES DEL CAM LOUIS BRAILE DONDE SE CONSTATÓ QUE LOS DETALLES SEÑALADOS EN VISITAS PREVIAS, YA HABÍAN SIDO CORREGIDOS Y SOLVENTADOS.

Resultados obtenidos

CONSOLIDAR LOS PROGRAMAS DE CONSTRUCCION, AMPLIACION Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Contribuciones

ABATIR EL REZAGO ESCOLAR Y CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA EDUCACIÓN CON ESPACIOS DIGNOS, SEGUROS Y CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO A SUS REALES NECESIDADES EN UN EJERCICIO CON TRANSPARENCIA ABSOLUTASE

Conclusiones

RECOMIENDA EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HASTA LA ENTREGA RECEPCION DE LAS OBRAS PARA UN CONTROL TRANSPARENTE EN LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2018-12-07

Fecha de validación de la información

2018-12-07

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN

Importe total de la comisión

3000.00

COMISIONADO

(Nombre y firma)



DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.
