

Anexo III
Oficio No: IFEQROO.DOYE.0990.19

INFORME DE LA COMISIÓN	
UNIDAD RESPONSABLE	FECHA DE ELABORACIÓN
DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO	27 DE AGOSTO DEL 2019
DATOS GENERALES	
NOMBRE DEL COMISIONADO	JOSE OSWALDO TUZ DOMINGUEZ
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 21/AGOSTO/2019 AL 22/AGOSTO/2019
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PUERTO MORELOS, BENITO JUÁREZ E ISLA MUJERES, Q.ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 1,890.00
<p>EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LO SIGUIENTE:</p> <p><u>ESCUELA PREESCOLAR GENERAL 30 DE ABRIL EN LOCALIDAD DE PETCACAB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.</u></p> <p>EN FORMA COORDINADA CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE OBRA OBSERVANDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS, QUEDANDO DE ACUERDO CON EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE CUANDO INICIEN LAS CLASES TERMINARAN LOS TRABAJOS YA QUE QUEDAN PENDIENTES POR DEFINIR CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y ASI MISMO PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN, UNA VEZ CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS.</p> <p>NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO SEGÚN CONTRATO YA FENECIÓ.</p> <p><u>ESCUELA PRIMARIA GENERAL ZAMNA, DE LA LOCALIDAD DE PETCACAB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.</u></p> <p>EN FORMA COORDINADA CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE OBRA OBSERVANDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS, Y DERIVADO QUE QUEDAN PENDIENTES POR DEFINIR CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE ACORDO QUE CUANDO INICIEN LAS CLASES TERMINARAN LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD, PARA QUE SE PROCEDA A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEDPCIÓN.</p>	



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

ARROYO HERRERA GONZALEZ MARTINEZ
Director de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO SEGÚN CONTRATO YA FENECIÓ.

ESCUELA PREESCOLAR 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN FISICA A LOS TRABAJOS CONTRATADOS OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD TAL Y COMO SE PUEDEN VER EN LAS IMAGENES, POR LO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO REALIZADO EN FECHAS PASADAS.

ESCUELA PREESCOLAR XCARET EN LA LOCALIDAD DE CAN CUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

EN FORMA COORDINADA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN FISICA A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, A PESAR DE QUE A LA EMPRESA CONTRATISTA NO SE LE HA PAGADO ESTIMACIONES TRAMITADAS, SE COMPROMETIERON CO LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO A TERMINAR LOS TRABAJOS EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE UNA VEZ CUMPLIDO EL COMPROMISO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN A LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

EN FORMA COORDINADA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN FISICA A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETÓ A TERMINAR LOS TRABAJOS EN UNA SEMANA, POR LO QUE UNA VEZ CUMPLIDO EL COMPROMISO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN A LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ESCUELA PREESCOLAR ISLA MUJERES EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE LA EMPRESA ESTÁ CUMPLIENDO CON EL ACUERDO TOMADO EN LAS OFICINAS DE ESTE IFEQROO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y TERMINARLOS.

SE PUDO OBSERVAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS, MISMO QUE SE COMPROMETIÓ A TERMINAR EN UNA SEMANA YA QUE TIENEN DETALLES PENDIENTES POR DEFINIR CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y UNA VEZ CONCLUIDOS SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA CUMPLA AL 100%.

ESCUELA PREESCOLAR TLALOC EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE LA EMPRESA ESTÁ CUMPLIENDO CON EL ACUERDO TOMADO EN LAS OFICINAS DE ESTE IFEQROO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y TERMINARLOS.



QUINTANA ROO
GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2022

ARQ. HIRSHY FERRER MARTÍNEZ
Director de Obras y Equipamiento



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

SE PUDO OBSERVAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA CONCLUIRLOS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR CORRESPONDEN A LA CANCELERIA DE ALUMINIO EN AULAS, COMENTANDO EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL PLANTEL DE PERSONAL NO LES PERMITIERON EL ACCESO HASTA QUE INICIEN LAS CLASES.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA CUMPLA AL 100%.

NOTA: DERIVADO A QUE EL PERSONAL DE LOS PLANTELES SE ENCUENTRAN DE VACACIONES EN ALGUNAS LOCALIDADES NO SE OBTUVIERON LOS SELLOS PARA LA CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN.


FIRMA DEL COMISIONADO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



QROO.gob.mx

RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BASICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018

Datos Generales

Instancia Gubernamental

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico

No titular

Tipo de responsable del gasto

Comisión costeadada por el sujeto obligado

Ejercicio

2019

Periodo que se reporta

agosto

Tipo de viaje

Nacional

Número de personas acompañantes

0

Importe ejercido por el total de acompañantes

0.00

Datos de la comisión

País de origen

México

Estado de origen

Quintana Roo

Ciudad de origen

Chetumal

Municipio de origen

Othón P. Blanco

País de destino

México

Estado de destino

Quintana Roo

Ciudad de destino

DIVERSAS LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PUERTO MORELOS, ISLA MUJERES Y BENITO JUÁREZ

Motivo del encargo o comisión

RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS QUE SE EJECUTAN CON RECURSOS DEL FAM BÁSICO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2018.

Fecha de salida

2019-08-21

Fecha de regreso

2019-08-22

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)

0.00

Hospedaje

0.00

Viáticos comprobados

1886.00

Viáticos sin comprobar

4.00

Importe ejercido por partida

1886.00

Recurso económico

Estatad

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión

1886.00

Importe total no erogado

4.00

Fecha de entrega del informe

2019-08-27

Reportes

Actividades realizadas

DANDO CUMPLIMIENTO A LA ENCOMIENDA DEL OFICIO DE COMISIÓN, EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA A DIVERSAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN LOCALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PUERTO MORELOS, ISLA MUJERES Y BENITO JUÁREZ, RESPECTIVAMENTE.

Resultados obtenidos

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERVISOR RESPONSABLE DE CADA OBRA QUE TIENEN A SU CARGO SE LLEVÓ UN RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO LAS EMPRESAS CONTRATISTAS, OBTENIENDO LO SIGUIENTE:

ESCUELA PREESCOLAR GENERAL 30 DE ABRIL EN LOCALIDAD DE PETCACAB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO.



SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE OBRA OBSERVANDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS, QUEDANDO DE ACUERDO CON EL SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO QUE CUANDO INICIEN LAS CLASES TERMINARAN LOS TRABAJOS YA QUE QUEDAN PENDIENTES POR DEFINIR CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y ASI MISMO PROCEDER AL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN, UNA VEZ CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LOS TRABAJOS.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO SEGÚN CONTRATO YA FENECIÓ.

ESCUELA PRIMARIA GENERAL ZAMNA, DE LA LOCALIDAD DE PETCACAB, MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO.

EN FORMA COORDINADA CON PERSONAL DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE OBRAS DE ESTE IFEQROO, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE OBRA OBSERVANDO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CONTINUÓ CON LOS TRABAJOS, Y DERIVADO QUE QUEDAN PENDIENTES POR DEFINIR CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL SE ACORDO QUE CUANDO INICIEN LAS CLASES TERMINARAN LOS TRABAJOS EN SU TOTALIDAD, PARA QUE SE PROCEDA A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEDPCIÓN.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO SEGÚN CONTRATO YA FENECIÓ.

ESCUELA PREESCOLAR 5 DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO MORELOS, MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS.

EN FORMA COORDINADA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN FISICA A LOS TRABAJOS CONTRATADOS OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN TERMINADOS EN SU TOTALIDAD TAL Y COMO SE PUEDEN VER EN LAS IMAGENES, POR LO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL COMPROMISO REALIZADO EN FECHAS PASADAS.

ESCUELA PREESCOLAR XCARET EN LA LOCALIDAD DE CAN CUN, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ.

EN FORMA COORDINADA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN FISICA A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, A PESAR DE QUE A LA EMPRESA CONTRATISTA NO SE LE HA PAGADO ESTIMACIONES TRAMITADAS, SE COMPROMETIERON CO LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO A TERMINAR LOS TRABAJOS EL DÍA 24 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, POR LO QUE UNA VEZ CUMPLIDO EL COMPROMISO SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN A LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ESCUELA SECUNDARIA ROSARIO CASTELLANOS EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL, MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

EN FORMA COORDINADA CON EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA Y SUPERVISOR DE ESTE IFEQROO SE REALIZO UNA VERIFICACIÓN FISICA A LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OBSERVANDO QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, POR LO QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SE COMPROMETÓ A TERMIANAR LOS TRABAJOS EN UNA SEMANA, POR LO QUE UNA VEZ CUMPLIDO EL COMPROMISO, SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN A LA BREVEDAD YA QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ESCUELA PREESCOLAR ISLA MUJERES EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE LA EMPRESA ESTÁ CUMPLIENDO CON EL ACUERDO TOMADO EN LAS OFICINAS DE ESTE IFEQROO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y TERMINARLOS.

SE PUDO OBSERVAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA CONCLUIR LOS TRABAJOS, MISMO QUE SE COMPROMETIÓ A TERMINAR EN UNA SEMANA YA QUE TIENEN DETALLES PENDIENTES POR

DEFINIR CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL Y UNA VEZ CONCLUIDOS SE PROCEDERÁ A REALIZAR EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA CUMPLA AL 100%.

ESCUELA PREESCOLAR TLALOC EN LA LOCALIDAD DE ISLA MUJERES, MUNICIPIO DE ISLA MUJERES.

EN FORMA COORDINADA CON EL SUPERINTENDENTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA, SE LLEVÓ A CABO EL RECORRIDO DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE EJECUCIÓN, OBSERVANDO QUE LA EMPRESA ESTÁ CUMPLIENDO CON EL ACUERDO TOMADO EN LAS OFICINAS DE ESTE IFEQROO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS Y TERMINARLOS.

SE PUDO OBSERVAR QUE LA EMPRESA CONTRATISTA CUENTA CON EL PERSONAL SUFICIENTE PARA CONCLUIRLOS EN SU TOTALIDAD, POR LO QUE LOS TRABAJOS PENDIENTES POR REALIZAR CORRESPONDEN A LA CANCELERIA DE ALUMINIO EN AULAS, COMENTANDO EL RESPRESENTANTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE POR LOS CAMBIOS QUE SUFRIO EL PLANTEL DE PERSONAL NO LES PERMITIERON EL ACCESO HASTA QUE INICIEN LAS CLASES.

NO SE OMITE MANIFESTAR QUE LA FECHA COMPROMISO YA FENECIÓ.

ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO OPORTUNO A LA OBRA CON LA FINALIDAD DE QUE LA EMPRESA CUMPLA AL 100%.

NOTA: DERIVADO A QUE EL PERSONAL DE LOS PLANTELES SE ENCUENTRAN DE VACACIONES EN ALGUNAS LOCALIDADES NO SE OBTUVIERON LOS SELLOS PARA LA CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN.

Contribuciones

VERIFICAR QUE LAS OBRAS QUE SE EJECUTAN CON LOS RECURSOS ESTATALES, SE REALICEN EN APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES Y EN BASE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE ESTABLECIDA, MEDIANTE EL MANEJO EFICAZ Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS.

Conclusiones

DE LAS OBSERVACIONES DETECTADAS DURANTE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, SE LE DARÁ EL SEGUIMIENTO A LAS CORRECCIONES, CON LA FINALIDAD DE SOLVENTAR Y CONCLUIR LAS OBRAS AL 100%.

Datos de la información

Periodo de actualización

octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información

2019-08-27

Fecha de validación de la información

2019-08-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA


Nota



DERIVADO A QUE EL PERSONAL DE LOS PLANTELES SE ENCUENTRAN DE VACACIONES EN ALGUNAS LOCALIDADES NO SE OBTUVIERON LOS SELLOS PARA LA CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN.

Importe total de la comisión

1890.00



COMISIONADO

(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.


CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: 0840

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ, LABORÓ EN DIVERSAS
LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE ISLA MUJERES Y BENITO JUÁREZ.

EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2019.




Nestor Eduardo Avila Blanco
NOMBRE Y FIRMA



POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE



ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA


SELLO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN
LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCIÓN

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y
PASAJES: **0840**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ANTE LA
CUAL SE DESARROLLA LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C. JOSÉ OSWALDO TUZ DOMÍNGUEZ, LABORÓ EN DIVERSAS
LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE FELIPE CARRILLO PUERTO, PUERTO
MORELOS Y BENITO JUÁREZ, EL DÍA 21 DE AGOSTO DE 2019.



NOMBRE Y FIRMA




JURISDICCIÓN SANITARIA No. 3
**CENTRO DE SALUD
RURAL
PETCACAB**
QRSSA000134
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIÓ CON LOS TRABAJOS EN COMENDADOS
EN TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

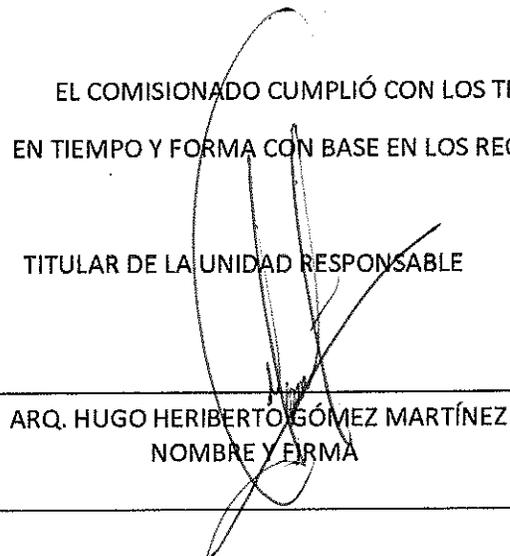


ARQ. HUGO HERIBERTO GÓMEZ MARTÍNEZ
NOMBRE Y FIRMA

DELEGACIÓN



IFEQROO
BENITO JUÁREZ



Noelia E. Auk Blanco
