



Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0998.24

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

27-08-24

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 22/08/2024 AL 26/08/2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL Y SOLIDARIDAD
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 6,891.90

22 DE AGOSTO DEL 2024

EL DÍA 22 DE AGOSTO DE 2024, LLEGAMOS A LAS OFICINAS A LAS 6:00AM PARA BUSCAR EL VEHÍCULO ASIGNADO, SE REALIZÓ LA REVISIÓN DEL VEHÍCULO CON EL VELADOR, SE NOS ENTREGÓ LAS LLAVES, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN Y/O EN PROCESO DE LICITACIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 4 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, PASAMOS EN HORARIO DE 10:30 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 11:15 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

SEC. CARLOS MONSIVAIS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 11:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FÍSICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:
SE HA ARMADO ACERO EN COLUMNAS PLANTA ALTA, SE COLARON COLUMNAS EN PLANTA ALTA ACTUALMENTE SE ELABORA CIMBRA EN TRABES, SE HABILITA ACERO PARA TRABES.
SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA 15%, FALTA MATERIAL Y MANO DE OBRA, LO QUE HAY NO SON SUFICIENTES, SE LE RECOMIENDO A EMPRESA A INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRO DE LOS MATERIALES

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM. VELIO VIVAZ VALDEZ
LOCALIDAD: COZUMEL.
MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, SE PRESENTÓ ING. ROUSSELL JAFET OLIVERA GONGORA, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA EJE CONSTRUCCIÓN DE PARAÍSO, S.A. DE C.V., SE MOSTRÓ EL LUGAR DONDE SE VA A PLANTAR LA NUEVA AULA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO DONDE SE VAN A REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, CRUZAMOS VÍA BARCO Y NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN.

23 DE AGOSTO DEL 2024

EL DÍA 23 DE AGOSTO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES: SE CONCLUYO CON EL HABILITADO DE LA TRABES T-1, T-2 Y T-3, SE HABILITA ACERO EN TRABES SE INICIA CON LA COLOCACION DE LA VIGUETA Y BOVEDILLA. SE PRETENDE COLAR ESTE VIERNES 30 AGOSTO DEL 2024. SE CALCULA UN AVANCE DEL 24%.

SE OBSERVA POCA GENTE, Y FALTA DE MATERIALES, SE LE RECOMIENDA INCREMENTAR GENTE Y SUMINISTRAR MATERIALES PARA CUMPLIR METAS. SE LE RECOMIENDA A LA EMPRESA COLOCAR EL TAPIAL, Y REALIZAR LA LIMPIEZA DEL AREA DONDE ESTAN REALIZANDO LOS TRABAJOS, DERIVADO DEL INICIO DE CLASES ESTE 26 DE AGOSTO DEL 2024.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA DEL 25%, OBRA ATRASADA SEGÚN PROGRAMA DE OBRA, SE ELABORA MURO DE BLOCK CON CADENA Y CASTILLO, SE ELABORA ACERO EN MÉNSULAS, SE OBSERVA BLOCK, VIGUETA, BOVEDILLA Y MALLA ELECTRO SOLDADA, SE COMPROMETE A COLAR LOSA EL PRÓXIMO VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024. SE LE RECOMIENDA A LA EMPRESA COLOCAR EL TAPIAL, Y REALIZAR LA LIMPIEZA DEL ÁREA DONDE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS, DERIVADO DEL INICIO DE CLASES ESTE 26 DE AGOSTO DEL 2024.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C-V., SE OBSERVA UN AVANCE INTENSO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYERON LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN PARTE INTERIOR, SE CONCLUYÓ LA COLOCACIÓN DE LOSETA EN INTERIOR, Y SE COLO PISO PARTE EXTERIOR, SE CONCLUYE APLANADOS EN EXTERIOR, SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA, SE INICIAN TRABAJOS DE HERRERÍA, CARPINTERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO. SE LE RECOMIENDA A LA EMPRESA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL AULA Y DEL ALREDEDOR DE ESTA, ASÍ COMO CONCLUIR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CANCELERÍA, HERRERÍA Y CARPINTERÍA. SE LE RECOMIENDA TRABAJAR SABADO Y DOMINGO, PARA CONCLUIR AULA Y SE PUEDA, UTILIZAR PARA EL INICIO DE CLASES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN

24 DE AGOSTO DEL 2024

EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 8:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C-V., SE OBSERVA UN AVANCE INTENSO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYERON LOS APLANADOS EN MUROS Y PLAFONES EN PARTE INTERIOR, SE CONCLUYÓ LA COLOCACIÓN DE LOSETA EN INTERIOR, Y SE COLO PISO PARTE EXTERIOR, SE CONCLUYE APLANADOS EN EXTERIOR, SE INICIAN TRABAJOS DE PINTURA, SE INICIAN TRABAJOS DE HERRERÍA, CARPINTERÍA Y CANCELERÍA DE ALUMINIO. SE LE RECOMIENDA A LA EMPRESA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL AULA Y DEL ALREDEDOR DE ESTA, ASÍ COMO CONCLUIR LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CANCELERÍA, HERRERÍA Y CARPINTERÍA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL SR. DAVID CASTILLO PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA PERSONA FISICA, SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES: SE CONCLUYO EL TAPIAL PARA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO, SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACTUALMENTE SIGUEN CON SUS LABORES EN AL ARMADO Y CIMBRA DE TRABES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 12:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ARQ. ULISES MARQUEZ PEREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA ARQUITECTURA MARQUEZ S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYO EL TAPIAL PARA DELIMITAR EL AREA DE TRABAJO, SE REALIZO LA LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO, ACTUALMENTE SIGUEN CON SUS LABORES EN AL ARMADO Y CIMBRA DE MENSULAS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, CRUZAMOS VIA BARCO Y NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN

25 DE AGOSTO DEL 2024

EL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 9:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. NICOLAS LLORENTE JUAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RMG WELDING SERVICES S.A. DE C-V., SE OBSERVA UN AVANCE INTENSO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CALCULA UN AVANCE DE OBRA DEL 60%, SE CONCLUYÓ EL AULA DIDÁCTICA, SE COLOCARON LAS LUMINARIAS, VENTILADORES, SE PINTÓ, SE COLOCÓ HERRERÍA, VENTANAS DE ALUMINIO Y PROTECTORES, SE COLOCÓ PITARRON, SE ENTREGÓ MOBILIARIO. SE TRABAJA EN LA ADECUACIÓN DE LA DIRECCIÓN TURNO VESPERTINO. SE LE RECOMIENDA A LA EMPRESA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL AULA Y DEL ALREDEDOR DE ESTA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS

Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN

26 DE AGOSTO DEL 2024

EL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2024, SE INICIAN NUESTRAS LABORES SALIENDO DE LAS 8:15 HRS DEL HOTEL DE LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, NOS DIRIGIMOS E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PRIM EVARISTO MONTEJO PEREZ
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 8:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS PRESENTAMOS CON LA DIRECTORA DEL PLANTEL, PARA PREGUNTAR SI TENIA ALGUNA OBSERVACION REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO, SE OBSERVA QUE SE CONCLUYO EL TAPIAL, Y SE REALIZO LA LIMPIEZA GENERAL, EL PERSONAL DE LA EMPRESA, SIGUE CON SUS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO INDICANDO LOS TRABAJOS A EJECUTAR, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM JOSE G. LOPEZ ESQUIVEL
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 9:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS PRESENTAMOS CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, PARA PREGUNTAR SI TENIA ALGUNA OBSERVACION REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO, SE OBSERVA QUE SE CONCLUYO EL TAPIAL, Y SE REALIZO LA LIMPIEZA GENERAL, EL PERSONAL DE LA EMPRESA, SIGUE CON SUS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
LOCALIDAD: PLAYA DEL CARMEN.
MUNICIPIO: SOLIDARIDAD.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, NOS PRESENTAMOS CON EL DIRECTOR DEL PLANTEL, PARA PREGUNTAR SI TENIA ALGUNA OBSERVACION REFERENTE A LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN EJECUTANDO, SE OBSERVA QUE SE CONCLUYO LA LIMPIEZA GENERAL, EL PERSONAL DE LA EMPRESA, SIGUE CON SUS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO DEONDE SE VAN HA REALIZAR LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, CRUZAMOS VIA BARCO Y NOS DIRIGIMOS A NUESTRO DESCANSO EN LA LOCALIDAD DE PLAYA DEL CARMEN, PERNOTANDO EN

ESTA CIUDAD, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULUM

LOCALIDAD: TULUM.

MUNICIPIO: TULUM.

SIENDO LAS 15:30 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. GUILLERMO CALVIÑO, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA AF INSTALACIONES, S.A. DE C.V., SE OBSERVA UN AVANCE INICIAL LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

NO HAN PODIDO TERMINAR LA BARDAS, SE SIGUE TRABAJANDO, SE COLOCAN BASES DE LUMINARIAS, SE COLOCA TUBERÍA ELÉCTRICA PARA LA ALIMENTACIÓN DE LUMINARIAS Y CASETA DE HIDRONEUMÁTICO, PLANTA DE TRATAMIENTO, Y BOMBAS.

SE DETERMINÓ UN 25% DE AVANCE. SE LE HABLO CON EL RESIDENTE DE LA EMPRESA, PARA QUE SUMINISTRE LOS MATERIALES Y EL AUMENTO DE FUERZA DE TRABAJO PARA PARA INCREMENTAR SU AVANCE.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS DIRIGIMOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 4.5 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0998.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0710**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: COZUMEL

EL DÍA: 22 DE AGOSTO DEL 2024



SEQ
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE QUINTANA ROO



SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESC. SEC. GRAL. "CARLOS MONSIVAIS"
CLAVE: 23DES0038N
COZUMEL, QUINTANA ROO

Elis Belen Antio Mac
NOMBRE Y FIRMA

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTERANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

22 AGO 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0998.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0710**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: SOLIDARIDAD.

EL DÍA: 23 DE AGOSTO DEL 2024


Carlos Enrique Vooz Chi
NOMBRE Y FIRMA

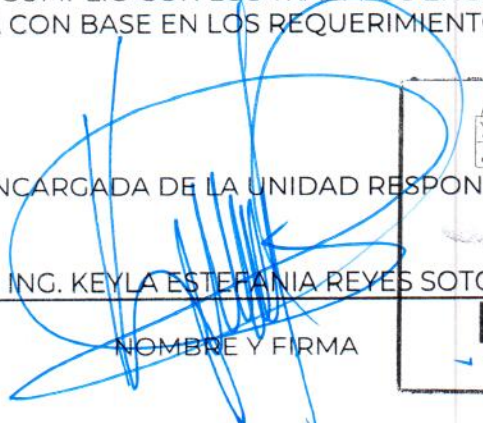
SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
PORF: JOSE GONZALO LOPEZ ESQU:VEL
C.C.T. 23DPR0708T
ZONA ESCOLAR 055
PLAYA DEL CARMEN, SOL, Q.ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

23 AGO 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION


NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0998.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0710**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: PLAYA DEL CARMEN

EL DÍA: 24 DE AGOSTO DEL 2024


NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
PORF. JOSE GONZALO LOPEZ ESQUIVEL
C.C.T. 23DPR0708T
ZONA ESCOLAR 055
PLAYA DEL CARMEN, SOL, Q. ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



24 AGO 2024
SELLO

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0998.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0710**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: SOLIDARIDAD.

EL DÍA: 25 DE AGOSTO DEL 2024


Carlos Enrique Lopez Eli
NOMBRE Y FIRMA

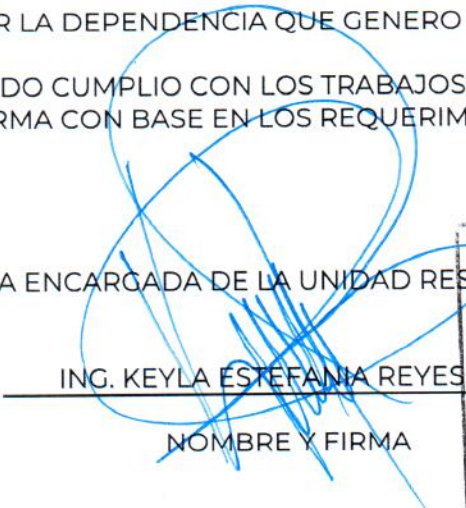
SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
PORF: JOSE GONZALO LOPEZ ESQUIVEL
C.C.T. 23DPR0708T
ZONA ESCOLAR 055
PLAYA DEL CARMEN, SOL, Q.ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA



25 AGO 2024

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.DOYE.0998.24** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0710**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN LOS MUNICIPIOS DE: SOLIDARIDAD.

EL DÍA: 26 DE AGOSTO DEL 2024


Carlos Enrique Xoxi Elu
NOMBRE Y FIRMA

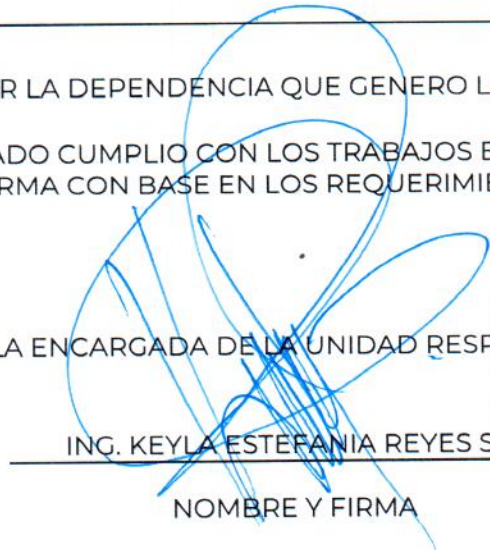
SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO
ESCUELA PRIMARIA
POR: JOSE GONZALO LOPEZ ESQUIVEL
C.C.T. 23DPR0708T
ZONA ESCOLAR 055
PLAYA DEL CARMEN, SOL., Q.ROO

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

LA ENCARGADA DE LA UNIDAD RESPONSABLE


ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

NOMBRE Y FIRMA

