



## INFORME DE LA COMISIÓN

### UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

### FECHA DE ELABORACIÓN

01 DE AGOSTO 2024

### DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	Arq. Miguel Fdo. Ceballos Mercado
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 29 AL 30 DE JULIO DEL 2024
LUGAR DE LA COMISIÓN	BENITO JUAREZ
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,126.67

### INFORME DE TRABAJO

**NOTA:** Por instrucciones de la Directora de Área, se modificó recorridos de obra, quedando como sigue.

**29 DE JULIO DEL 2024.**

Se realizo reunión de trabajo en las oficina de Secretaria de Educación de las Zona Norte con personal del área de planeación, en referencia a la construcción de las aulas que se deberán de tener para nuevo ciclo escolar, el cual se comprometieron a entregar únicamente las aulas para el finde mes.

Posterior a la reunión se procedió a realizar recorrido d supervisión en la Escuela Secundaria de Nueva Creación Fraccionamiento Sac Be.

Se pernocto en la Ciudad de Cancún.



**30 DE JULIO DEL 2024.**

Por indicaciones de la Directora de área, se procedió a realizar el recorrido de supervisión de las obras que se realizan en la Ciudad de Cancún, adjuntamente con el Director general, en la que se Visitó los planteles siguientes:

**Secundaria de nueva creación Fraccionamiento Sac Be.** Se dio trazo al edificio C. en los edificios A y B se trabaja en excavaciones y armado de zapatas.

Prim. María del Socorro Puerto, Se trabaja en Excavaciones, Armados de zapatas y columnas.

Secundaria 8 de Marzo, En Edificio D, se trabaja en Excavaciones y colado de plantillas y armado de zapatas, en edificio Laboratorios, se trabaja en excavaciones.

J.N. Sin Nombre, Fracc. Cielo Nuevo, Se trabaja en muros, cadenas y castillos y preparación de losa para adose.

Prim. Francisco Hoil, Se trabaja en Excavaciones. Se definió nivel de desplante.

Secundaria CAM, de nueva creación. Se definió los trazos y niveles, únicamente se tiene despalmado el área de plaza cívica.

Primaria Enrique Méndez Palma, se realiza excavaciones, se inició con concreto ciclópeo, pero se suspendieron los trabajos por mal procedimiento de elaboración del concreto ciclópeo.

Sec. Miguel de Cervantes Saavedra, Se tiene colado de columnas, se observó que no tiene revolvedora, se pidió pruebas de concreto. Se solicitó anticipar materiales y equipo y los concretos deberán de ser premezclados.

Prim. Nueva creación Fracc. Paraíso Maya, de Aula, se tiene Excavación de zapatas. De Domo se tiene excavaciones y colado de plantilla así como armado de zapata.

Secundaria Cancún, Se tiene excavaciones y plantillas, se habilita aceros de columnas, zapatas y otros armados.

Prim. Rosario Cáceres, Se tiene Colado de columna, inicia con habilitado de acero de trabes, se pidió material faltante de cimbra y agregados.

Secundaria de Nueva creación Fracc. Kusamil, Únicamente se definió los edificio se pidió a la empresa entrar para hacer el desmonte correspondiente, se pidió respetar la mayoría de los árboles.

FIRMA DEL COMISIONADO



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
 EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
 Y PASAJES: No. IFEQROO.DOyE.0937.24 FOLIO 0650

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE LA  
 C.

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE:

EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ

LOS DÍAS:

29 DE JULIO DEL 2024



NOMBRE Y FIRMA

SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
 Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO



29 JUL 2024

**RECIBIDO**

DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

SELLO



**IFEQROO**  
 INSTITUTO DE  
 INFRAESTRUCTURA  
 FÍSICA EDUCATIVA  
 DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

**CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES  
 EN LUGARES DISTINTOS AL DE ADSCRIPCIÓN.**

**NÚM. DE OFICIO DE LA ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS  
 Y PASAJES:** No. IFEQROO.DoyE.0937.24 FOLIO 0650

**POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA  
 ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.**

HAGO CONSTAR QUE LA C. ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO

LABORO EN ESTA CIUDAD DE: EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

LOS DÍAS: 30 DE JULIO DEL 2024

*[Handwritten Signature]*  
 NOMBRE Y FIRMA

*[Stamp]*  
 SELLO

**POR LA DEPENDENCIA QUE GENERÓ LA COMISIÓN**

**EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN TIEMPO  
 Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.**

EL TITULAR DE LA UNIDAD RESPONSABLE

ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

*[Stamp]*  
 RECIBIDO  
 DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Oficio Interno No. IFEQROO.D0yE.0937.24  
Asunto: Comisión de trabajo  
Chetumal, Quintana Roo, a 26 de Julio del 2024


2024 año del 50 aniversario del estado libre y soberano de Quintana Roo

ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO  
JEFE DEL DEPTO. DE SUP. ZONA CENTRO Y SUR.  
EDIFICIO

POR ESTE MEDIO INFORMO A USTED SU COMISIÓN DE TRABAJO DEL 29 al 30 de Julio DEL 2024, CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO LA SUPERVISIÓN DE OBRAS DE LOS PROGRAMAS FAMSUP Y VISITA DE A SITIO DE LOS TRABAJOS, EN EL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ.

A SU RETORNO DEBERA INFORMARME DE LOS RESULTADOS DE ESTA COMISION.

ATENTAMENTE

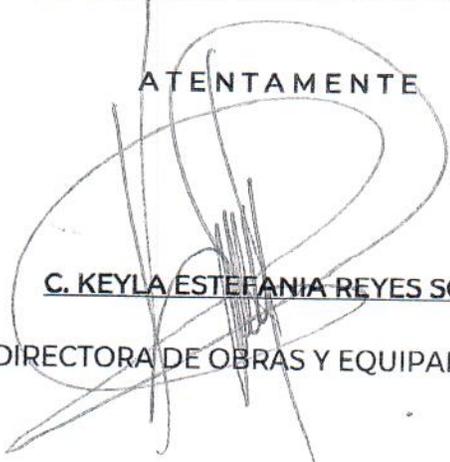

C. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO  
DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

ANEXO 3  
ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES (ANTICIPADO)

Ejercicio	Trimestre	Tipo de Plaza y numero de empleado	Clave o nivel del puesto	Denominación del Puesto	Denominación del cargo	Área de adscripción
2024	3°	CONFIANZA 0027	500	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	JEFE DE DEPTO. ZONA CENTRO Y SUR	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

Nombre completo de la persona comisionada			Denominación del encargo o comisión	Tipo de viaje (Nacional / Internacional)	Numero de personas acompañantes en el encargo o comisión de la persona comisionada	Importe ejercido por el total de acompañante
Nombre (s)	Primer apellido	Segundo apellido				
MIGUEL FERNANDO	CEBALLOS	MERCADO	SUPERVISION DE OBRAS EN EL bBENITO JUAREZ	NACIONAL	0.00	0.00
Banco y CLABE Interbancaria						
R.F.C.:						

Lugar de adscripción de la persona comisionada			Lugar del encargo o comisión			Motivo del encargo o comisión
País	Estado	Ciudad /Localidad	País	Estado	Ciudad /Localidad	
MEXICO	QUINTANA ROO	CHETUMAL	MEXICO	QUINTANA ROO	MUNICIPIO BENITO JUAREZ	SUPERVISION DE OBRA

Medio de transporte	Hospedaje		Periodo del encargo o comisión	
			Salida (día/mes/año)	Regreso (día/mes/año)
TERRESTRE (VEHICULO OFICIAL)	SI ( X )	NO ( )	29/07/2024	30/07/2024

Clave de partidas	Denominación de la partida	Importe asignado por concepto de gasto de viáticos
26101	COMBUSTIBLE	\$
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$
37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$
	HOSPEDAJE	\$
		\$
		1,089.27
		1,037.40
		2,126.67

COMISIONADO  
ARO, MIGUEL FERNANDO, CEBALLOS, MERCADO

AUTORIZACION JEFE INMEDIATO DEL COMISIONADO  
ING. KEYLA ESTEFANIA REYES SOTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C. MTR. OMAR EDU DORANTES BARBA

TITULAR  
C. JOSE BILBALAN DIAZ

Me comprometo a comprobar, el importe asignado en concepto de viáticos y/o pasajes, por el monto otorgado y con la documentación correspondiente, y en su caso reintegrar los importes no devengados, dentro de un periodo máximo de 5 días al término de la comisión, en el evento de omitir esta obligación, autoriza me sea descontado en importe correspondiente de mi sueldo en la quincena de aplique.

**PROGRAMA DE RECORRIDO DE SUPERVISION**

FECHA: 26-jul-24

PERIODO DE LA COMISION:

DEL 29 AL 30 DE JULIO DE 2024

SECTOR BENITO JUAREZ  
 SECTOR COZUMEL  
 SECTOR FELIPE CARRILLO PUERTO  
 SECTOR JOSE MARIA MORELOS  
 SECTOR LAZARO CARDENAS  
 SECTOR SOLIDARIDAD  
 SECTOR TULUM  
 SECTOR ISLA MUJERES.

X

NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	29/07/2024				OBSERVACIONES
				TIEMPO DE LUNES	TIEMPO DE VISITA	KMS RECORRIDOS	TIEMPO DE VIAJE	
	SEC. NUEVA CREACION FRACC. SAC BE	CHETUMAL	SALIDA	06:00				
	SEQ DELEGACION CACNUN	CANCUN	BENITO JUAREZ	11:00	03:00	420	05:00	SPERVISION
	IFEQROO DELEGACION CANCUN	CANCUN	BENITO JUAREZ	16:00	02:00	25	05:00	REUNION
		CANCUN	BENITO JUAREZ	18:30	01:00	25	00:30	REUNION
			<b>PERNOCTA</b>	19:30				
			<b>TOTAL</b>			<b>470</b>		
NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	UBICACION	30/07/2024				OBSERVACIONES
				TIEMPO DE MARTES	TIEMPO DE VISITA	KMS RECORRIDOS	TIEMPO DE VIAJE	
	SEC. NUEVA CREACION FRACC. SAC BE	CANCUN	SALIDA	09:00				
	FRANCISCO HOIL	CANCUN	BENITO JUAREZ	09:30	03:00	15	00:30	SPERVISION
	PRIM. CIELO NUEVO 4 ETAPA	CANCUN	BENITO JUAREZ	13:00	01:00	15	00:30	SPERVISION
	J.N PARAISO MAYA	CANCUN	BENITO JUAREZ	14:30	01:00	15	00:30	SPERVISION
	PRIM. PARAISO MAYA	CANCUN	BENITO JUAREZ	16:00	01:00	15	00:30	SPERVISION
			<b>CHETUMAL</b>			410		
			<b>TOTAL</b>			<b>450</b>		
NIVEL	OBRA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	30/07/2024				OBSERVACIONES
				TIEMPO DE MIERCOLES	TIEMPO DE VISITA	KMS RECORRIDOS	TIEMPO DE VIAJE	
			CHETUMAL			410		
			<b>TOTAL</b>			<b>410</b>		
			<b>KILOMETRAJE TOTAL</b>			<b>1330</b>		

AUTORIZO:  
 C. ING. KEYLA ESTEFANIA REYES-SOTO  
 DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

COMISIONADO:  
 ARQ. MIGUEL FERNANDO CEBALLOS MERCADO  
 JEFE DEL DEPTO. SUPERV. ZONA SUR Y CENTRO
