

Oficio No.: IFEQROO.DOYE.0429.25

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO

FECHA DE ELABORACIÓN

12-05-25

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	ING. JOEL MEX HERRERA
CARGO DEL COMISIONADO	SUPERVISOR DE OBRA
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 09/05/2025 AL 09/05/2025
LUGAR DE LA COMISIÓN	MUNICIPIO COZUMEL
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$2,274.35

09 DE MAYO DEL 2025

EL DÍA 09 DE MAYO DE 2025, LLEGAMOS A LA ESTACION DE AUTOBUCES ADO A LAS 12:30AM, PARA ABORDAR EL AUTOBUS A LAS 00:55 HORAS, POR LO QUE POSTERIORMENTE SALIMOS DE LA CIUDAD DE CHETUMAL, PARA INICIAR CON LA VISITA DE LOS PLANTELES EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, SE HIZO UN RECORRIDO DE 5.00 HORAS, AL LLEGAR A LA CIUDAD DE PLAYA DEL CARMEN NOS DIRIGIMOS AL MUELLE PARA PASAR A COZUMEL, SE HIZO UN RECORRIDO DE 15 MINUTOS, PASAMOS EN HORARIO DE 7:00 HORAS, LLEGAMOS COMO LAS 7:30 HORAS, NOS DIRIGIMOS A LA OBRA, E INICIAMOS CON LA VISITA DE OBRA, EN EL PRIMER PLANTEL:

PREESCOLAR XAMAN-HA

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 8:00 HORAS, LLEGAMOS AL PLANTEL, ESTABA PRESENTE LA DIRECTORA PROFA. JULISA DEL C. CHACON ALCOCER, EL C. LUIS PEREZ, REPRESENTADO A LA EMPRESA GLENDA GUADALUPE LOPEZ ZAMORA, SE OBSERVA LA OBRA ABANDONADA, CON UN AVANCE LENTO, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS A LA FECHA, SON LAS SIGUIENTES:

SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DEL TRANSFORMADOR, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DEL TRANSFORMADOR, NO HAY MATERIAL, NO HAY MANO DE OBRA, LA PERSONA QUE ASISTIÓ COMENTO QUE ESTÁ EN ESPERA DEL MATERIAL, SE HABLÓ CON EL SUPERINTENDENTE MENCIONANDO QUE LA EL PRÓXIMO MARTES LLEGA EL MATERIAL.

SE TRABAJA EN LA ELABORACION DE CIMBRA PARA TRABES, SE CONCLUYO EL FONDEO DE LAS TRABES, SE TRABAJA CIMBRA EN LATERALES SE CONCLUYO EL HABILITADO DEL ACERO EN TRABES T-1, T-2 Y T-3, SE REALIZA LA CANALIZACION DE LAS INSTALACIONES, YA ESTA LA VIGUETA Y BOVEDILLA, SE PRETENDE COLAR LA LOSA Y TRABES LA PROXIMASEMANA. SE LE INDICA AL SUPERINTENDENTE DE OBRA, QUE LA OBRA ESTA ATRASADA QUE DEBERA INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO Y SUMINISTRAR LOS MATERIALES NECESARIOS.

SE INDICA AL SUPERINTENDENTE QUE DEBERÁ INCREMENTAR FUERZA DE TRABAJO, ASÍ COMO SUMINISTRAR EL MATERIAL NECESARIO YA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA ATRASADA LA OBRA. SE DETERMINÓ UN 40.00% DE AVANCE.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS. POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

PRIM ELADIO NOVELO GIL

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 10:00 HORAS, LLEGAMOS AL TERRENO DEL PLANTEL, EN CONJUNTO CON EL C. LUIS PEREZ, NOS ATENDIÓ EL DIRECTOR DEL PLANTEL PROF. MANUEL SANSORES HOIL, SE ENTREGÓ DOCUMENTACIÓN, Y NOS COMENTÓ QUE EL CABLE QUE VA DEL POSTE A LA MUFA DE LA ESCUELA SE SOBRECALENTÓ Y SE DESPRENDIÓ QUEMADO, QUEDANDO SIN ENERGÍA EL PLANTEL, LLEGO PERSONAL DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEQ ENTREGO DICTAMEN.

SE INDICA AL SUPERINTENDENTE QUE DEBERÁ SOLVENTAR LOS TRABAJOS INDICADOS EN EL DICTAMEN.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

CAM GREGORIA E. FRANCO VIVAS

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 11:30 HORAS, LLEGAMOS AL PLANTEL, ESTABA PRESENTE EL ING. MANUEL JESUS BRICEÑO AMARO, REPRESENTANTE DE LA EMPRESA TECNICOS DIAZOSO S. DE R.L. DE C.V., Y LA PROFA. MARIA GUADALUPE DAMAS SANTANA, DIRECTORA DEL PLANTEL, CON LA FINALIDAD DE REALIZAR UN RECORRIDO PARA PODER PROGRAMAR LA ENTREGA DE LA OBRA. SE EXPLICO EL ALCANCE DEL PRESUPUESTO, Y PARA PODER ENTREGAR SE HICIERON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- LA REJA ACERO SE OBSERVA 2 TRAMOS DAÑADOS, SE DEBERAN CAMBIAR. SE DEBERA EMPOTRAR EL POSTE QUE TIENE MOVIMIENTO.
- CONECTAR EDIFICIO CON TABLERO E INTERRUPTOR PARA QUE TENGA ENERGIA.
- TIRAR BASURA PARTE POSTERIOR.

SE ACUERDA UN PLAZO DE 15 DIAS, PARA SOLVENTAR, Y POSTERIORMENTE PROGRAMAR LA ENTREGA DE OBRA.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS. POSTERIORMENTE NOS TRASLADAMOS AL SIGUIENTE PLANTEL:

UQROO COZUMEL

LOCALIDAD: COZUMEL.

MUNICIPIO: COZUMEL.

SIENDO LAS 13:00 HORAS, POR ORDEN DE MI JEFE INMEDIATO ME MANDARON PARA VERIFICAR TRABAJOS REALIZADOS POR EL INSTITUTO, Y PRESENTAN FILTRACIONES EN LAS LOSAS DE ALGUNOS EDIFICIOS, LLEGAMOS AL PLANTEL, NOS RECIBÍ EL ING. GREGORIO, NOS DIRIGIMOS EN LOS EDIFICIOS, PASAMOS EN LOS LUGARES DONDE SE FILTRA EL AGUA, Y POSTERIORMENTE SUBIMOS EN 2 LOSAS DE LAS TRES QUE PRESENTAN FILTRACIONES. OBSERVANDO LO SIGUIENTE:

- LAS LOSAS SON INCLINADAS, DEMASIADAS INCLINADAS PARA QUE SE ESTANQUE EL AGUA, NO SE PUDO ANDAR EN LA LOSA POR LO DEMASIADA PENDIENTE, Y NO HAY EQUIPO DE PROTECCIÓN.
- SE OBSERVA EL IMPERMEABILIZANTE EN BUEN ESTADO.

LAS CONCLUSIONES SON LAS SIGUIENTES:

- NO SE DIO EL ADECUADO TRATAMIENTO A LA SUPERFICIE DE LA LOSA, NO SE HABRA SELLADO LAS FISURAS.
- NO SE NIVELÓ LA SUPERFICIE, SE APLICÓ DIRECTO EL IMPERMEABILIZANTE.
- OTRA CAUSA QUE ESTE MAL INSTALADO EL IMPERMEABILIZANTE, MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA HIZO LOS TRABAJOS.

SE REALIZÓ EL RECORRIDO OBSERVANDO LOS TRABAJOS, SE TOMARON DATOS, FOTOGRAFÍAS Y SE LES ACLARARON DUDAS RESPECTO A LOS TRABAJOS.

UNA VEZ CONCLUIDOS NUESTRAS ACTIVIDADES ENCOMENDADAS, NOS TRASLADAMOS VIA BARCO A COZUMEL, POSTERIORMENTE FUIMOS A LA TERMINAL DE LA ADO, PARA DIRIGIRNOS A LA CIUDAD DE CHETUMAL, DADO QUE SE CONCLUYÓ LOS TRABAJOS DE NUESTRA COMISIÓN. SE REALIZÓ UN RECORRIDO DE 5.00 HORAS APROXIMADAMENTE.



FIRMA DEL COMISIONADO
ING. JOEL MEX HERRERA
SUPERVISOR DE OBRA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

CONSTANCIA DE DESEMPEÑO DE LABORES O COMISIONES TEMPORALES EN LUGARES DISTINTOS A LA ADSCRIPCION

NÚM DE OFICIO **IFEQROO.D0yE.0429.25** DE LA ORDEN DE
MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS Y PASAJES: FOLIO **0219**

POR EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ANTE LA CUAL SE DESARROLLO LA COMISIÓN.

HAGO CONSTAR QUE EL C: ING. JOEL MEX HERRERA

ELABORO EN ESTA CIUDAD EN EL MUNICIPIO DE: COZUMEL

EL DÍA: 09 DE MAYO DEL 2025

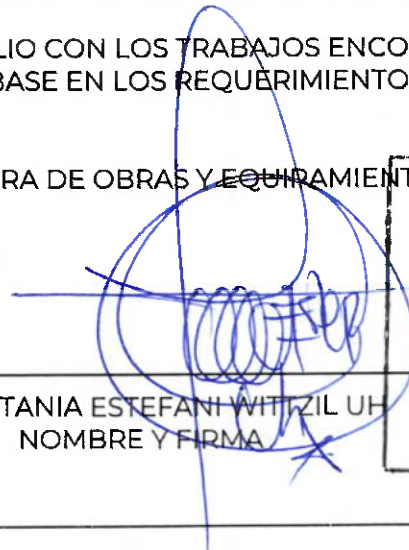

Julisa del C. Chacón Alcocer -
NOMBRE Y FIRMA

SEQ
SERVICIOS EDUCATIVOS
DE QUINTANA ROO
JARDÍN DE NIÑOS
"XAMAN HA"
CLAVE: 23DJN0100X
COZUMEL, Q. ROO
SELLO

POR LA DEPENDENCIA QUE GENERO LA COMISION

EL COMISIONADO CUMPLIO CON LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS EN
TIEMPO Y FORMA CON BASE EN LOS REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS.

DIRECTORA DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO


ARQ. TANIA ESTEFANI WITZIL UH
NOMBRE Y FIRMA



IFEQROO
INSTITUTO DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

09 MAY 2025

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO
