

Anexo III
Oficio No.: IFEQROO.DCySO.1783.18

INFORME DE LA COMISIÓN

UNIDAD RESPONSABLE

DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA

FECHA DE ELABORACIÓN

30 DE JULIO 2018

DATOS GENERALES

NOMBRE DEL COMISIONADO	HUGO HERIBERTO GOMEZ MARTINEZ
CARGO DEL COMISIONADO	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS
ADSCRIPCIÓN DEL COMISIONADO	DIRECCION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE OBRA
PERIODO DE LA COMISIÓN	DEL 18 AL 20 DE JULIO DE 2018
LUGAR DE LA COMISIÓN	UQROO-CANCÚN, Q. ROO
IMPORTE DE VIÁTICOS OTORGADOS	\$ 2,575.00

SE REALIZÓ SEGUIMIENTO DE OBRA DEL PROGRAMA FAMSUPERIOR CIEN DENOMINADA "CONSTRUCCIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN" EN SUS MODULOS B, C Y D.

CONTRATOS

LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17
LP-IFEQROO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17
LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17
LP-IFEQROO-RIVEROLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17

SE ADJUNTA INFORME PORMENORIZADO

FIRMA DEL COMISIONADO

ARQ. HUGO HERIBERTO
GOMEZ MARTINEZ

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REUNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



INFORME DE OBRA.



SUPERVISIÓN DE OBRA: U. Q. ROO CANCÚN.

Reporte de avance al **20** de **JULIO** del **2018**.



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

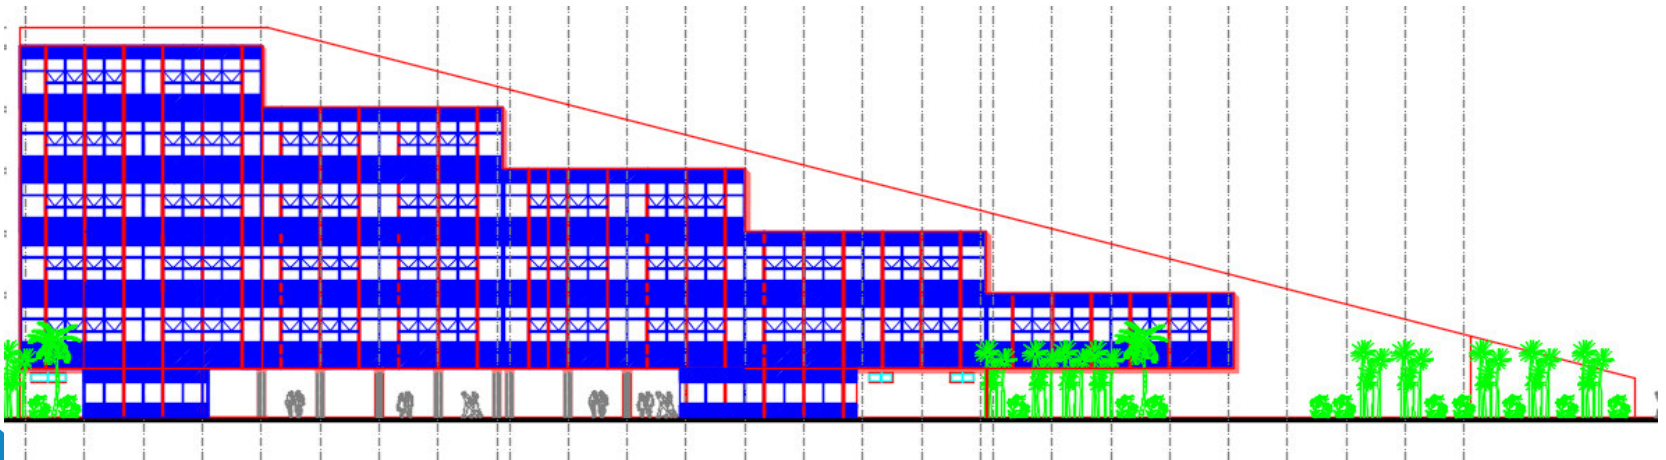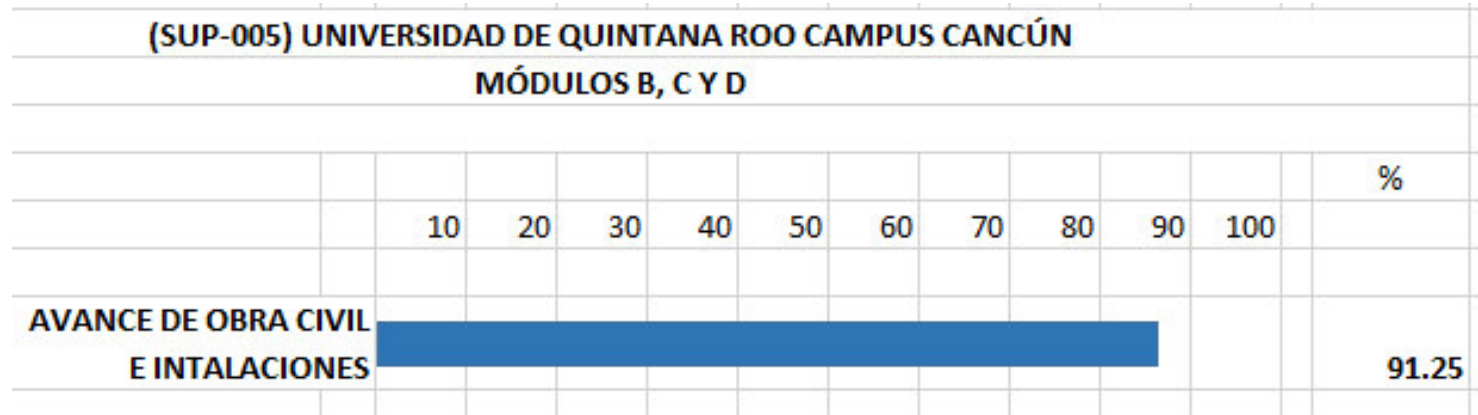

FACHADA PRINCIPAL



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



MODULO B



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

CONTRATO: LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-039/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 26'178,649.94

PERIODO DE CONTRATO: 180 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE DICIEMBRE 2017 A 15 DE JUNIO DE 2018.

PERIODO DE CONVENIO: 16 DE JUNIO 2018 A 30 DE JUNIO DE 2018.

COMPONENTES: EDIFICIO DE 6 PLANTAS

- ✚ PLANTA BAJA: CAFETERIA, AREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTIL.
- ✚ 1ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 2DO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 3ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 4TO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 5TO NIVEL: 2 AULAS Y TERRAZA.

INICIO DE LOS TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2017





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES MODULO B

SEGUNDO PISO

- APLANADO EN MUROS DE PASILLO EXTERIORES

TERCER PISO

- APLANADOS EN MUROS EXTERIORES DE PASILLOS

CUARTO PISO

- APLANADOS EXTERIORES

QUINTO PISO

- APLANADO DE MURO VELA Y TERRAZA.

FACHADA INTEGRAL

CONTINUAN CON LA COLOCACION DE POSTES Y ALUMINIO EN
PRIMER PISO

INICIAN CON LA COLOCACIÓN DE CRISTAL

ACTIVIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR MODULO B

PLANTA BAJA

- LOSETA EN PISO DE AREA DE CONVIVENCIA
- CANCELERIA EN COMEDOR
- FORMACION DE TALUDES DE ARROPE

PRIMER PISO

- LIMPIEZA

SEGUNDO PISO

- LIMPIEZA.

TERCER PISO

- TERMINACION DE APLANADOS EN MUROS DE BALCON
EXTERIOR

CUARTO PISO

- APLANADOS EN MUROS DE BALCON EXTERIOR

QUINTO PISO

- APLANADO EN MUROS DE BALCON INTERIOR/EXTERIOR
- TERMINACION APLANADO DE MURO VELA
- APLANADO EN MUROS DE PASILLOS EXTERIOR

AZOTEA

- IMPERMEABILIZANTE



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-B		MAQUINARIA Y EQUIPO M-B	
PERFIL	CANTIDAD	PERFIL	CANTIDAD
CABO	3	CARGADOR FRONTAL	1
ALBAÑIL	37	GENERADOR DE CORRIENTE 8HF	2
PINTORES	2	GENERADOR MAXILIGHT	1
CARPINTERO	2	GENERADOR DE VOLTAJE 220	1
FIERRERO	1	GENERADOR PARA SOLDAR	2
TABLAROQUEROS	5	ROMPEDOR ELECTRICO 9,13 Y 17	6
COLOCADOR	8	REHILETE ELECTRICO	5
ALUMINERO	15	SIERRA ELECTRICA	3
PASTERO	4		
HERRERO	5		
AYUDANTE EN GENERAL	32	SUMA	21
LIMPIEZA	4		
OPERADORES	1		
ALMACENISTA	2		
ADMINISTRATIVO	1		
SUPERINTENDENTE	1		
COORDINADOR	1		
JEFES DE FRENTE	1		
JEFE DE OBRA	1		
SUMA	126		

INCREMENTO EN SU FUERZA DE TRABAJO A RAZÓN DE 37 PERSONAS, CON DISMINUCIÓN DE UN EQUIPO EN MAQUINARIA DE OBRA CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE JULIO




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES

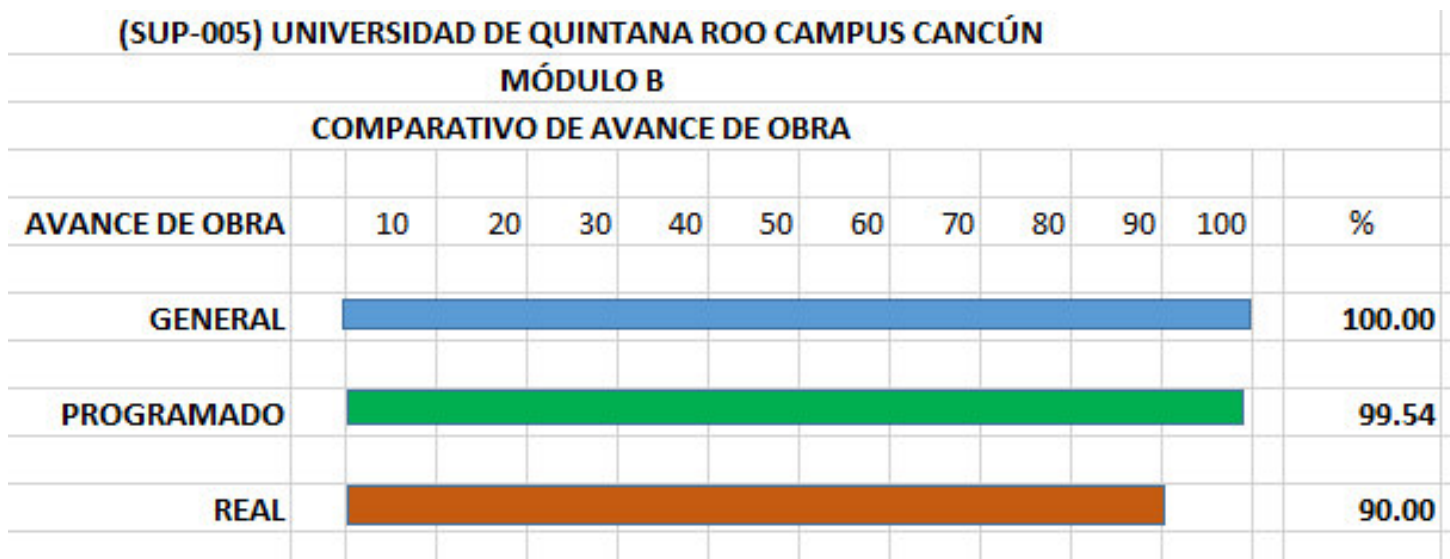



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA DE ESTIMACIONES

STATUS ESTIMACIONES DE OBRA

ESTIMACIONES MODULO B

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE
01	445,641.06
02	332,621.50
03	433,727.92
04	681,034.06
05	1,024,188.07
06	925,050.33
07	1,644,101.26
08	1,119,862.84
09	584,544.31
10	3,245,022.23
11	866,064.49
12	3,540,443.02

SUMAS 14,842,301.09

JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
				445,641.06
				332,621.50
				433,727.92
				681,034.06
				1,024,188.07
				925,050.33
				1,644,101.26
				1,119,862.84
				584,544.31
				3,245,022.23
866,064.49				
			3,540,443.02	

866,064.49

-

3,540,443.02

10,435,793.58



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún

Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



MODULO C



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: JOELRO CONSTRUCCIONES SA DE CV

CONTRATO: LP-IFEQROO-JOELRO-FAMSUPCIEN-OB-040/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 18'631,238.43

PERIODO DE CONTRATO: 150 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE DICIEMBRE 2017 A 06 DE JUNIO DE 2018.

COMPONENTES: EDIFICIO DE 4 PLANTAS

- ✚ PLANTA BAJA: AREA DE CONVIVENCIA ESTUDIANTEL, GIMNASIO Y NUCLEO SANITARIOS.
- ✚ 1ER NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 2DO NIVEL: 4 AULAS
- ✚ 3ER NIVEL: 2 AULAS Y TERRAZA

INICIO DE LOS TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2017



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO


Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN MODULO C PLANTA BAJA

- CANCELERIA EN AREA DE GIMNASIO ZONA DE FACHADA

PRIMER PISO

- COLOCACION DE PUERTAS MODUMEX

SEGUNDO PISO

- COLOCACION DE PUERTAS MODUMEX

TERCER PISO

- APLANADO DE MURO VELA
- COLADO EN RAMPA DE ESCALERAS

AZOTEA

- CONSTRUCCIÓN DE MURO VELA
- APLANADO DE MUROS EN ESCALERA

ACTIVIDADES PENDIENTES MODULO C PLANTA BAJA

- ARROPE DE TALUD

PRIMER PISO

- APLANADO EN MUROS BALCON EXTERIOR

SEGUNDO PISO

- APLANADO EN FACHADAS MURO BALCON

TERCER PISO

- APLANADO EN MUROS PASILLOS Y BALCON INTERIOR/EXTERIOR
- TERMINACION DE MURO VELA

AZOTEA

- LIMPIEZA
- CAPA DE NIVELACIÓN
- COLOCACION DE LOSETA EN TERRAZA Y TERMINACION DE MURO VELA



Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-C	
PERFIL	CANTIDAD
Residente de obra	1
Mtro. de obra	1
Of. Fierros	2
Carpinteros	4
Alumineros	8
Albañiles	20
Herreros	6
Colocadores	6
Tablaroqueros	6
Plomero	1
pintor	5
Pastero	3
Ayudantes	30
Limpieza	3
Velador	1
Chofer	1
SUMA	98

Maquinaria y Equipo

Cantidad	Descripción
2	Vibrador
1	Sierras para madera
1	Guillotinas para acero
4	En total

INCREMENTO A RAZÓN DE 12 PERSONAS EN SU MANO DE OBRA CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE JULIO.




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES

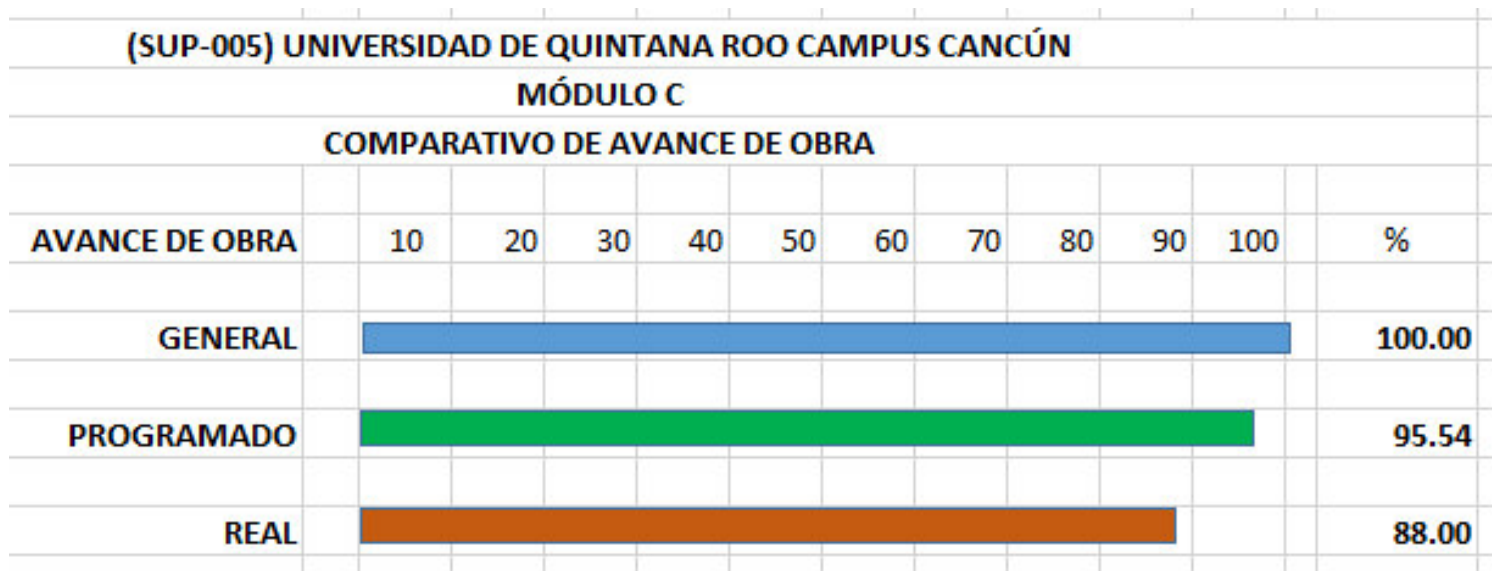



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA DE ESTIMACIONES

ESTIMACIONES MODULO C

	PRESENTADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO
01	1,162,101.26
02	1,003,525.35
03	1,005,166.32
04	1,919,936.16
05	1,231,943.48
06	1,479,959.49
07	1,298,755.13

SUMAS **9,101,387.19**

JOELRO CONSTRUCCIONES SA DE CV

EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
-				1,162,101.26
-				1,003,525.35
				1,005,166.32
				1,919,936.16
-				1,231,943.48
				1,479,959.49
1,298,755.13				

1,298,755.13

-

7,802,632.06



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



MODULO D



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

CONTRATO: LP-IFEQROO-JMERCADER-FAMSUPCIEN-OB-041/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 8'355,338.34

PERIODO DE CONTRATO: 120 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE DICIEMBRE 2017 A 15 DE MAYO DE 2018

PERIODO DE CONVENIO: 15 DE MAYO 2018 A 15 DE JUNIO DE 2018.

COMPONENTES: EDIFICIO DE 2 NIVELES

-  PLANTA BAJA: AUDITORIO/USOS MULTIPLES 207 PERSONAS.
-  1ER NIVEL: 2 AULAS

INICIO DE LOS TRABAJOS: 18 DE DICIEMBRE DE 2017



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES EN EJECUCIÓN MODULO D PLANTA BAJA

- COMPACTACION DE MATERIAL DE BANCO EN EXPLANADA DE ACCESO

PRIMER PISO

- COLOCACION DE CRISTAL EN FACHADA INTEGRAL

SEGUNDO PISO

- TERMINACIÓN DE MURO VELA
- CONSTRUCCION DE BANCAS EN TERRAZAS
- CONSTRUCCION DE BASES PARA COMPRESORES

ACTIVIDADES PENDIENTES MODULO D

PLANTA BAJA

- TERMINAR LA COMPACTACIÓN DE RELLENO CON MATERIAL DE BANCO EN EXPLANADA DE ACCESO
- ARROPE DE TALUDES
- FIRME EN EXPLANADA ACCESO

PRIMER PISO

- APLANADOS EN FACHADA MURO VELA EXTERIOR

AZOTEA

- TERMINACION DE MURO VELA



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA M-D	
PERFIL	CANTIDAD
CABO	1
ALBAÑIL	8
TABLAROQUEROS	1
PASTERO	1
PINTOR	2
AYUDANTE EN GENERAL	3
LIMPIEZA	2
ALMACENISTA****	3
ADMINISTRATIVO****	1
SUPERINTENDENTE	1
COORDINADOR****	1
JEFE DE OBRA****	1
SUMA	25

DISMINUYÓ SU FUERZA DE TRABAJO DE OBRA A RAZÓN DE 51 PERSONAS CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE JULIO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA ESTIMACIONES

ESTIMACIONES MODULO D

JORGE ENRIQUE MERCADER RODRIGUEZ

	PRESENTADAS	EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO					
01	260,022.46	-				260,022.46
02	79,617.01	-				79,617.01
03	442,750.26	-				442,750.26
04	604,681.29					604,681.29
05	610,298.20					610,298.20
06	368,806.91					368,806.91
07	245,181.52					245,181.52
08	224,053.58					224,053.58
09	468,172.03				-	468,172.03
10	557,847.98				-	557,847.98
11	147,074.87	147,074.87				
12	505,873.03				505,873.03	
	4,514,379.14	147,074.87	-		505,873.03	3,861,431.24




IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES

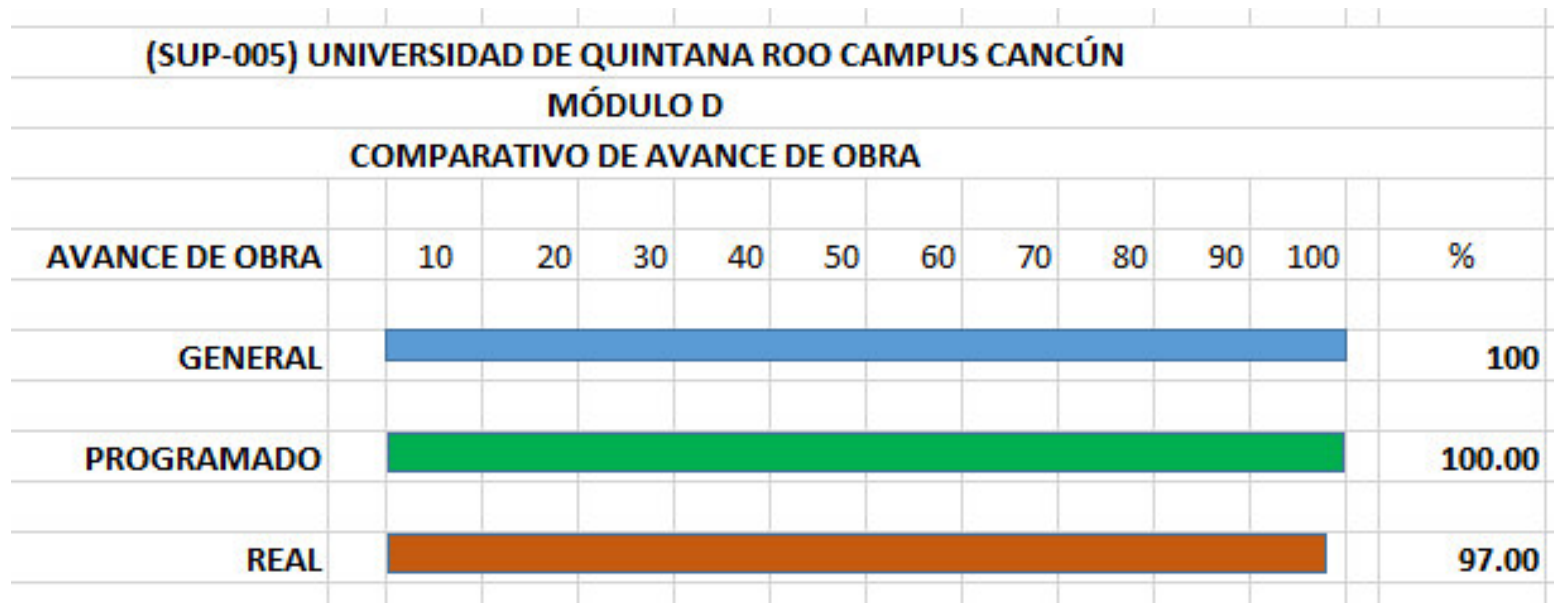



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: MARIO RIVERO

CONTRATO: LP-IFEQROO-RIVEROLEAL-FAMSUPCIEN-OB-038/17

MONTO DE CONTRATO: \$ 19'254,553.82

PERIODO DE CONTRATO: 120 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 24 DE ABRIL 2017 A 21 DE AGOSTO DE 2017

PERIODO DE CONVENIO: 05 DE MZO 2018 A 02 DE JULIO DE 2018


COMPONENTES: INSTALACION ELECTRICA EN LOS MODULOS B, C Y D

INICIO DE LOS TRABAJOS: 22 DE ENERO DE 2018



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

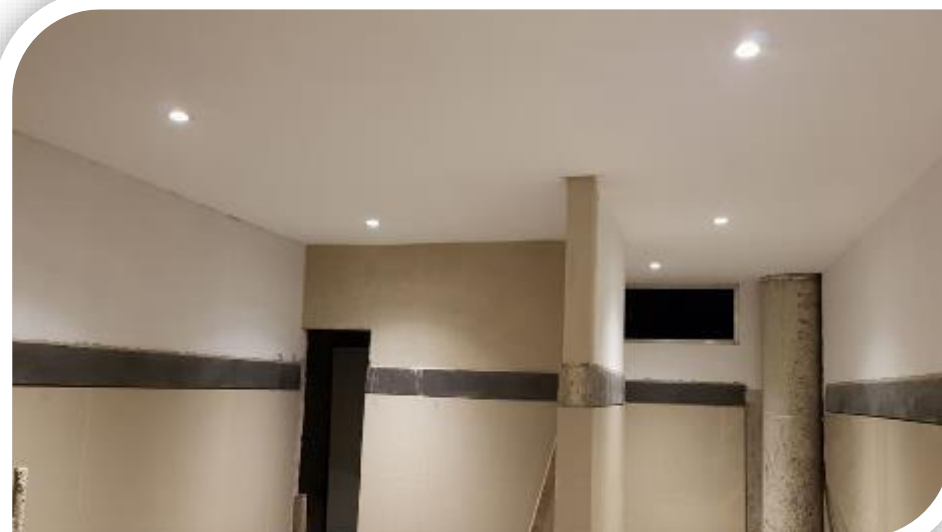



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Notas Relevantes

ACTIVIDADES INSTALACION ELECTRICA Y DE AIRE ACONDICIONADO

MOD B

- QUINTO PISO: COLOCACION DE CASSETTES DE AIRE ACONDICIONADO
- COLOCACION DE CABLES DE VOZ Y DATOS

MOD C

- SEGUNDO PISO: COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESCALERAS Y TERRAZAS
- TERCER PISO: COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESCALERAS Y TERRAZAS

MOD D

- PLANTA BAJA: COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESCALERAS Y TERRAZAS
- PRIMER PISO: COLOCACION DE LUMINARIAS EN ESCALERAS Y TERRAZAS



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA INSTALACIONES ELEC Y AC	
PERFIL	CANTIDAD
CABO	1
OFICIAL ELECTRICO	7
AYUDANTE EN GENERAL	7
ADMINISTRATIVO	1
SUPERINTENDENTE	1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
SUMA	18

DISMINUYÓ SU FUERZA DE TRABAJO A RAZÓN DE 5 PERSONAS DE OBRA CON RESPECTO A LA SEMANA DEL 10 AL 13 DE JULIO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA ESTIMACIONES

ESTIMACIONES

MARIO FÉLIX RIVERO LEAL

	PRESENTADAS		EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO						
01	577,875.93						577,875.93
02	1,246,943.92			\$ -			1,246,943.92
03	628,835.02		-	\$ -			628,835.02
04	365,298.71			\$ -			365,298.71
	2,818,953.58		-	-			2,818,953.58



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.

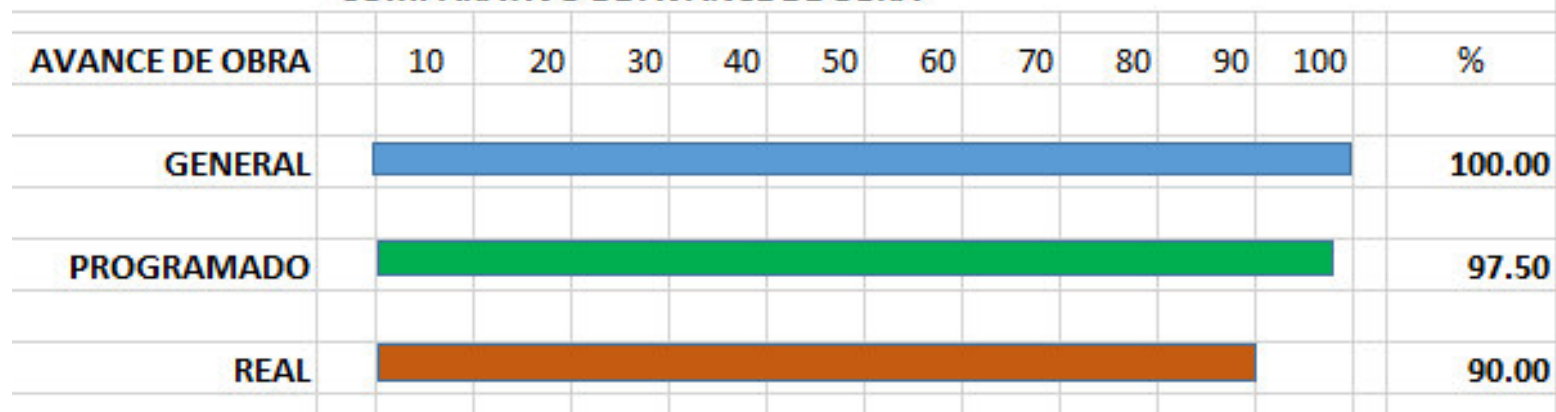


GRAFICO DE AVANCES

(SUP-005) UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO CAMPUS CANCÚN

INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO

COMPARATIVO DE AVANCE DE OBRA





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.

Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún

Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



JUICIOS ORALES Y ESTACIONAMIENTO



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



CONTRATISTA: FORZA DRILL, S.A. DE C.V.

CONTRATO: LP-IFEQROO-FORZA-FAMSUPCIEN-OB-098/18

MONTO DE CONTRATO: \$ 7'782,953.56

PERIODO DE CONTRATO: 26 DIAS NATURALES

PERIODO DE EJECUCIÓN: 20 DE JUNIO 2018 A 15 DE JULIO DE 2018.

PERIODO DE CONVENIO: .

COMPONENTES: ESTACIONAMIENTO Y JUICIOS ORALES

INICIO DE LOS TRABAJOS: 20 DE JUNIO DE 2018



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



Recursos disponibles

MANO DE OBRA ESTACIONAMIENTO	
PERFIL	CANTIDAD
Residente de obra	1
Topografo	1
ayte topografo	1
of. Electrico	1
Tablaroquero	1
Ayudante Gral	4
Operador	4
checador	1
SUMA	14

MAQUINARIA Y EQUIPO M-B	
PERFIL	CANTIDAD
VIBROCOMPACTADOR TERRACE	1
MOTOCONFORMADORA	1
RETROEXCAVADORA CAT 320D	1
SUMA	3

NOTAS:

- 1.-SIN CAMBIOS EN SU FUERZA DE TRABAJO
- 2.-INCREMENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO

ELLO CON REFERENCIA AL PERIODO DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2018.



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



ACTIVIDADES

ESTACIONAMIENTO

- COMPACTACIÓN DE BASE HIDRAULICA
- CONFORMACIÓN DE TERRAPLEN CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE
- REVISIÓN DE NIVELES DEL CUERPO DE TERRACERIAS

JUICIOS ORALES

- SIN AVANCE
- SUMINISTRO DE EQUIPO DE AUDIO, VIDEO, COMUNICACIÓN, VOZ Y DATOS.



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.





IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



TABLA ESTIMACIONES

ESTIMACIONES		FORZA DRILL SA DE CV					
	PRESENTADAS		EN INIFED (México)	INIFED (Chetumal)	EN REVISION IFEQROO	EN REVISION SUPERVISION IFEQROO	PAGADAS
No. ESTIM	IMPORTE LIQUIDO						
01	2,294,513.44		2,294,513.44				-
02	-			\$ -			-
03	-		-	\$ -			-
04	-			\$ -			
2,294,513.44			2,294,513.44	-			-



IFEQROO
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Supervisión de obra.
Construcción de los módulos B, C y D UQROO Cancún
Municipio Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo.



GRAFICO DE AVANCES

