



UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO
DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN
DEPARTAMENTO DE CÓMPUTO Y TELEMÁTICA


Chetumal, Quintana Roo, 14 noviembre 2018
UQROO/DGTIC/DCT

“2018, Año por una Educación Inclusiva”

Reporte del cableado estructurado Unidad Académica Cancún.

- Planta Baja.

Los cables se supone que inician en el baño o gimnasio donde quedaría el IDF, se solicitó que se moviera de ubicación al gimnasio, pero ambas ubicaciones están cerradas con plafón corrido terminado por lo cual no se puede asegurar el estado de los cables ni su exacta ubicación.

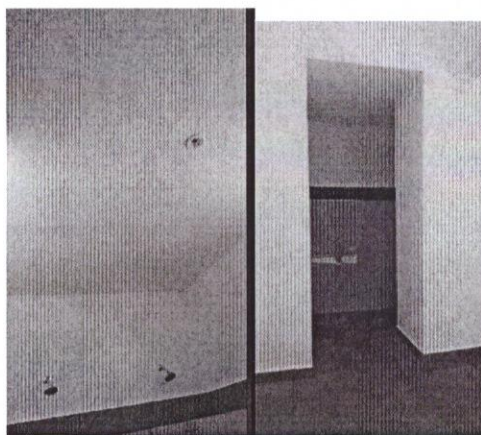

- Primer piso

Se verificó casi todo el cable, inicia el cable en el salón 110, se anexa tabla de Excel con la información obtenida del cableado, no están rematados o ponchados en un patch panel en el IDF del piso, solo están asentados sobre la escalerilla identificados cada cable, sola cables identificados como antena están afuera de los salones, los cuales no pueden ser alcanzados por que están sobre el plafón corrido el cual no tiene registro o forma de acceder a la ubicación donde quedó el cable.



Boulevard Bahía s/n, esquina Ignacio Comonfort, Colonia del Bosque, Código Postal 77019, Chetumal, Quintana Roo, México. Teléfono
+(983)83.50300, Fax +(983)83.29656 www.uqroo.mx
